






Periodo Reportado: <b>SEGUNDO TRIMESTRE 2024.</b>		Fecha de elaboración: <b>1 DE JULIO DE 2024</b>											
<b>CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR</b>													
Nivel de Indicador	Tipo de indicador	Área Responsable:											
COMPONENTE 2	GESTIÓN	DIRECCIÓN DE PARQUES, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN											
Resumen Narrativo													
ACCIONES OPERATIVAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE RECINTOS Y PARQUES A CARGO DEL ORGANISMO, REALIZADAS.													
Nombre del Indicador													
NÚMERO DE ACCIONES OPERATIVAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE RECINTOS Y PARQUES A CARGO DEL ORGANISMO REALIZADAS.													
Definición del Indicador													
SON ACCIONES OPERATIVAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, LAS QUE SE REALIZAN A LOS RECINTOS Y PARQUES A CARGO DEL ORGANISMO, CON LA FINALIDAD DE QUE OPEREN EN ÓPTIMAS CONDICIONES DURANTE LOS EVENTOS QUE SE REALIZA EN ELLOS.													
Medios de Verificación													
CARPETA FÍSICA DENOMINADA "ACCIONES DE MANTENIMIENTO A RECINTOS Y PARQUES 2024", RESGUARDADA POR LA DIRECCIÓN DE PARQUES, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRAL, SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE: 2023.													
Supuesto													
LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SE REALIZAN SIN LA NECESIDAD DE UN PROVEEDOR EXTERNO QUE DIFICULTE SU CUMPLIMIENTO OPORTUNO Y QUE IMPIDA QUE SE LLEVEN A CABO LOS EVENTOS.													
Comportamiento del Indicador:	Frecuencia de Medición:	Unidad de Medida:	Dimensión del Indicador:										
NOMINAL	TRIMESTRAL	ACCIÓN	EFICIENCIA										
		Meta del Indicador:											
		100% 38											
<b>LÍNEA BASE</b>													
Valor	Año	Período	PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN										
90	2023	DICIEMBRE	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Aceptable</td> <td style="text-align: center;">En riesgo</td> <td style="text-align: center;">Crítico</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">95.00% a 115.00%</td> <td style="text-align: center;">90.00% a 94.99%</td> <td style="text-align: center;">0.00% a 89.99%</td> </tr> </table>	Aceptable	En riesgo	Crítico	95.00% a 115.00%	90.00% a 94.99%	0.00% a 89.99%				
Aceptable	En riesgo	Crítico											
95.00% a 115.00%	90.00% a 94.99%	0.00% a 89.99%											
<b>VARIABLE 1</b>													
TOTAL DE ACCIONES OPERATIVAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE RECINTOS Y PARQUES A CARGO DEL ORGANISMO, REALIZADAS.													
CALENDARIZACIÓN DE METAS PROGRAMADAS													
MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUMULADO
NÚM.			9			10			10			9	38
%			24%			26%			26%			24%	100%
AVANCE DE METAS 2024 (VALOR REALIZADO)													
MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUMULADO
NÚM.			9			10							19
%			24%			26%			0%			0%	50%
<b>ANÁLISIS DEL LOGRO</b>							<b>JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO (MAYOR O MENOR)</b>						
Explique clara y concisamente, en qué consistió el logro de la meta.							Explique clara y concisamente, las razones por las que no se cumplió o no se superó la meta.						
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REALIZARON ACCIONES CONTUNDENTES PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE LOS PARQUES Y RECINTOS PONIENDO ESPECIAL ATENCIÓN EN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS INMUEBLES Y EQUIPAMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS A LOS VISITANTES DE ESTOS ESPACIOS; TODO CON EL FIRME OBJETIVO DE BRINDAR UNA EXPERIENCIA AGRADABLE Y A LA ALTURA DE LAS EXPECTATIVAS DE LOS POBLANOS.							 <b>CONVENCIÓNES Y PARQUES</b> DIRECCIÓN DE PARQUES, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR</b>													
Período	Valor Programado	Valor Realizado	Gráfica de Comportamiento										
Primer Trimestre	9	9											
Segundo Trimestre	10	10											
Tercer Trimestre	10	0											
Cuarto Trimestre	9	0											
TOTAL	38	19											
Elaboró			Revisó			Autorizó							
 ITZEL ADRIANA MENDIETA VARGAS ASISTENTE DE DIRECCIÓN			 MISAEL RAMÓN JUÁREZ GARCÍA DIRECTOR DE PARQUES MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			 JONATHAN MACÍAS APARICIO COORDINADOR GENERAL OPERATIVO							

**DIRECCIÓN DE PARQUES, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y  
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**


**CUADRO DE RESUMEN**

**SEGUNDO TRIMESTRE 2024**

**COMPONENTE 2**

NÚMERO DE ACCIONES OPERATIVAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE RECINTOS Y PARQUES A CARGO DEL ORGANISMO REALIZADAS.

ACCIÓN	CANTIDAD
RESCATE Y REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DE INFORMACIÓN DEL RÍO ATOYAC.	1
MANTENIMIENTO CON PINTURA A MOBILIARIO, INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE LOS PARQUES: BICENTENARIO, CENTRO CIVICO CULTURAL 5 DE MAYO, PARQUE DEL ARTE, ECOLÓGICO, METROPOLITANO Y CIUDAD MODELO AUDI	1
REHABILITACIÓN DE LA CISTERNA EN LA FUENTE/ESCULTURA GOTAS DE VIDA EN EL PARQUE METROPOLITANO.	1
MANTENIMIENTO A CABAÑAS ECOLÓGICAS DEL PARQUE FLOR DEL BOSQUE	1
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL PARQUE METROPOLITANO	1
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE PLAZA DE TOROS EL RELICARIO	1
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE PLAZA DE TOROS EL RELICARIO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PINTURA	1



MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE TEATRO PRINCIPAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PINTURA.	1
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN SALÓN PASTORA, ANALCO, LUZ Y ALTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES	1
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN SALÓN LORETO, SANITARIOS, LOBBY Y COCINA CENTRAL DEL CENTRO EXPOSITOR	1
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>


ITZEL ADRIANA MENDIETA VARGAS  
ASISTENTE DE DIRECCIÓN

MISAEEL RAMÓN JUÁREZ GARCÍA  
DIRECTOR DE PARQUES,  
MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y  
TECNOLOGÍAS DE LA  
INFORMACIÓN



14 JUN 2024

Parque:	MÓDULO DE INFORMACIÓN DEL RÍO ATOYAC	
	Fecha:	03-06-2024
	Número:	014-2024

 Descripción general: SUBDIRECCIÓN DE PARQUES	REHABILITACIÓN DE PABELLONES DEL MÓDULO DE INFORMACIÓN DEL RÍO ATOYAC
--	---

Responsable de supervisión:	RAÚL MILLÁN CASTAÑEDA		
Fecha de inicio:	01-05-2024	Fecha de cierre:	31-05-2024

**Tareas a Ejecutar**


- Trabajos de mantenimiento en los 3 pabellones donde se realizaron trabajos de:
- Renovación de la pintura en el interior.
  - Rehabilitación y mejora en los sistemas de iluminación con la sustitución de luminarias fundidas y la instalación de nuevos rieles de iluminación LED.
  - Se colocaron 3 murales impresos a gran formato sobre el periodo del Pleistoceno como parte de la información correspondiente a la nueva propuesta educativa.
- Se adquirieron 3 fósiles de animales prehistóricos que forman parte del arenero didáctico incluido en la propuesta educativa.
- Retoque de pintura en las mamparas, estanques y canales del ciclo del agua y botes de basura
  - Se repararon y pintaron las 800 tablas de pasillos y andadores del MIRA.
  - Se realizaron trabajos de albañilería para desviar la ruta de desagüe del canal del ciclo del agua.
  - Se realizó la actualización y renovación de los contenidos de educación ambiental

Equipos requeridos:	Herramientas menores, materiales e información actualizada de la propuesta.
Observaciones:	Ninguna


Ejecutó: Constantino Villar Salazar	Cargo: Asistente de Dirección
Supervisó: Raúl Millán Castañeda	Cargo: Encargado del Parque
Validó: Jose Luis Acevedo Hernández	Cargo: Subdirector de Parques



Firma del Ejecutor



Firma del Supervisor



Firma de autorizado

Parque:	BICENTENARIO
Fecha:	02 - 05 - 2024
Número:	012

Descripción general:	PINTURA GENERAL PARQUE BICENTENARIO
----------------------	-------------------------------------

Responsable de supervisión:	BALDOMERO CORTES ATILANO		
Fecha de inicio:	01-04-2024	Fecha de cierre:	30-04-2024


Tareas a Ejecutar	
- Aplicación de pintura de 255 metros lineales de guarnición, 8 juegos infantiles, 4 ejercitadores y teatro del aire	
Equipos requeridos:	4 brochas de 4", 2 brochas de 2", 1 bote de 19 lts. de pintura amarilla, 1 bote de 19 lts. de pintura roja, 2 botes de 19 lts. de pintura azul y 2 botes de 19 lts. de pintura blanca, estopa y thinner.
Observaciones:	

Superviso: BALDOMERO CORTES ATILANO	Cargo: ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO C
Ejecuto: ARMANDO LIMON QUINTERO	Cargo: AGENTE DE SEGURIDAD
Autorizo: : JOSE LUIS ACEVEDO HERNANDEZ	Cargo: SUBDIRECTOR DE PARQUES


CONVENCIONES  
Y PARQUES

05 MAY 2024

RECIBIDO  
SUBDIRECCIÓN DE PARQUES



Firma del Supervisor



Firma del Ejecutor



Firma de Autorizado

Parque:	BICENTENARIO	
	Fecha:	02-05-2024
	Número:	012



Descripción general:	PINTURA GENERAL PARQUE BICENTENARIO
----------------------	-------------------------------------




CONVENCIONES  
— Y PARQUES —


05 MAY 2024

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
SUBDIRECCIÓN DE PARQUES

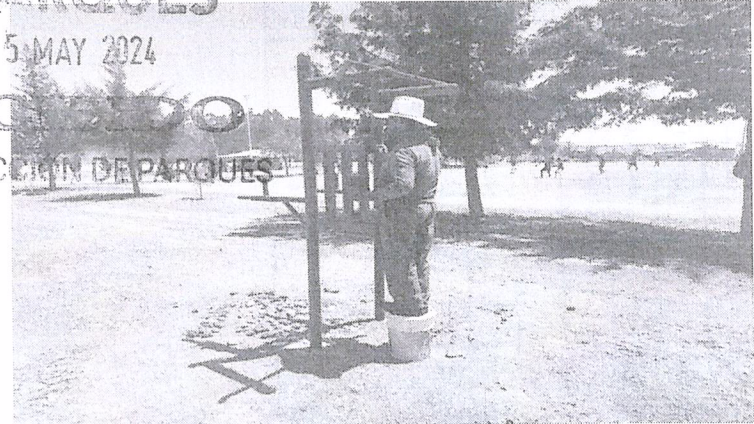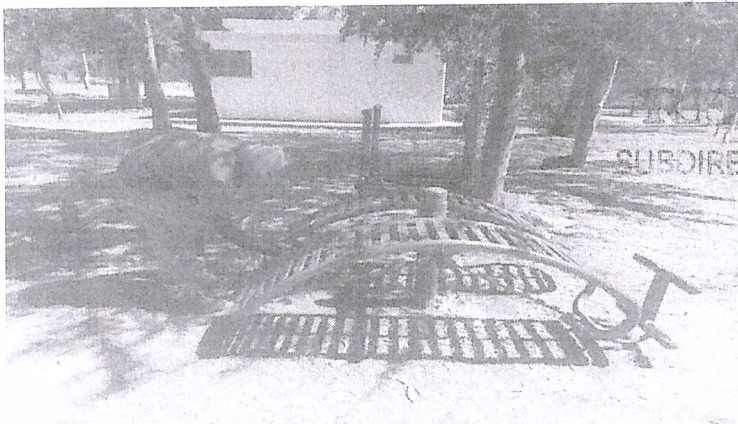

  
Firma del Supervisor

  
Firma del Ejecutor

  
Firma de Autorizado

Parque:	BICENTENARIO	
	Fecha:	03 - 06 - 2024
	Número:	015

Descripción general:	PINTURA GENERAL PARQUE BICENTENARIO
----------------------	-------------------------------------

Responsable de supervisión:	BALDOMERO CORTÉS ATILANO		
Fecha de inicio:	01-05-2024	Fecha de cierre:	31-05-2024

Tareas a Ejecutar	
- Se realizó la aplicación de pintura en 200 metros cuadrados de guarniciones, 4 fuentes y 10 porterías.	
Equipos requeridos:	4 brochas de 4 pulgadas, 2 brochas de 2 pulgadas, 1 bote de 19 litros de pintura amarilla, 1 bote de 19 litros de pintura roja, 2 botes de 19 litros de pintura azul y 2 botes de 19 litros de pintura blanca, estopa y thinner.
Observaciones:	<b>CONVENCIONES — Y PARQUES —</b>

04 JUN 2024

Ejecutó: Armando Limón Quintero	<b>RECIBIDO</b> SUBDIRECCIÓN DE PARQUES	Cargo: Agente de Seguridad
Supervisó: Baldomero Cortés Atilano		Cargo: Analista Especializado Consultivo C
Autorizó: : José Luis Acevedo Hernández		Cargo: Subdirector de Parques

Firma del Ejecutor

Firma del Supervisor

Firma de Autorizado


GOBIERNO DEL  
ESTADO DE PUEBLA

Convenciones  
y Parques

Parque:	BICENTENARIO	
	Fecha:	03-06-2024
	Número:	015

Descripción general:

PINTURA GENERAL PARQUE BICENTENARIO

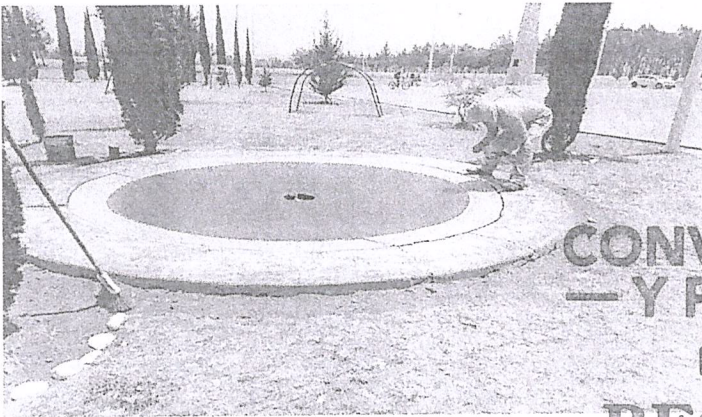


CONVENCIONES  
— Y PARQUES —

04 JUN 2024

RECIBIDO

SUBDIRECCIÓN DE PARQUES

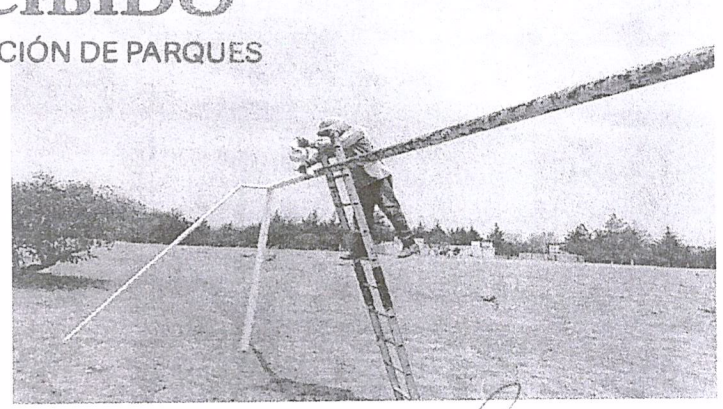

Firma del Ejecutor

Firma del Supervisor

Firma de Autorizado



Convenciones  
y Parques

Parque:	<b>BICENTENARIO</b>	
	Fecha:	<b>24 - 06 - 2024</b>
	Número:	<b>017</b>

Descripción general:	<b>PINTURA GENERAL PARQUE BICENTENARIO</b>
----------------------	--

Responsable de supervisión:	<b>BALDOMERO CORTÉS ATILANO</b>		
Fecha de inicio:	<b>01-06-2024</b>	Fecha de cierre:	<b>21-06-2024</b>

<b>Tareas a Ejecutar</b>	
- Aplicación de pintura de 8 botes de basura, 3 aparca bicis y 7 bancas.	
Equipos requeridos:	<b>4 brochas de 4", 2 brochas de 2", 2 botes de 19 litros de pintura blanca, 1 bote de 19 litros de pintura roja, estopa y thinner.</b>
Observaciones:	

Supervisó: <b>BALDOMERO CORTÉS ATILANO</b>	Cargo: <b>ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO C</b>
Ejecutó: <b>ARMANDO LIMÓN QUINTERO</b>	Cargo: <b>AGENTE DE SEGURIDAD</b>
Autorizó: <b>JOSÉ LUIS ACEVEDO HERNÁNDEZ</b>	Cargo: <b>SUBDIRECTOR DE PARQUES</b>

**CONVENCIONES  
— Y PARQUES —**

24 JUN 2024

**RECIBIDO**

SUBDIRECCIÓN DE PARQUES

  
Firma del Supervisor


  
Firma del Ejecutor

  
Firma de Autorizado

Parque:	BICENTENARIO	
Fecha:	24-06-2024	
Número:	017	

Descripción general:

**PINTURA GENERAL PARQUE BICENTENARIO**

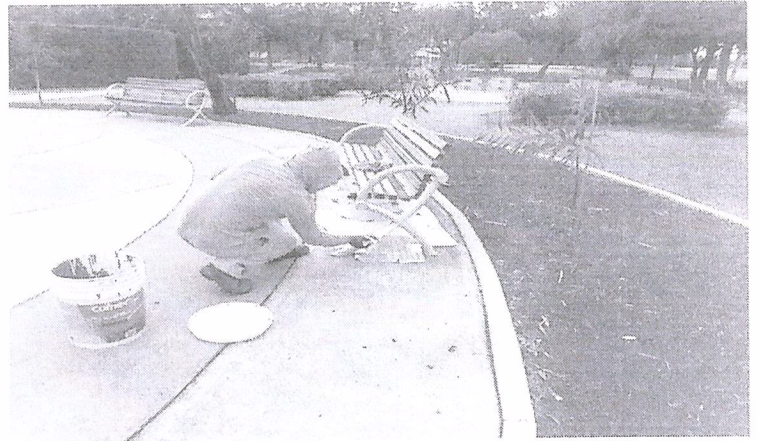

Firma del Supervisor



Firma del Ejecutor



Firma de Autorizado


Parque:	CENTRO CÍVICO CULTURAL 5 DE MAYO	
	Fecha:	02-05-2024
	Número:	021-2024


Descripción general:	PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRO CÍVICO CULTURAL 5 DE MAYO
----------------------	---


Responsable de supervisión:	RICARDO GIOVANNI RAMOS MASTRANZO		
Fecha de inicio:	01-04-2024	Fecha de cierre:	30-04-2024

Tareas a Ejecutar	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pintura y rehabilitación de 6,950 metros cuadrados de Reja Emblemática</li> <li>• Pintura y rehabilitación a 83 metros en Muros del Centro Expositor</li> </ul>	
<p><b>CONVENCIONES — Y PARQUES —</b></p> <p>05 MAY 2024</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>SUBDIRECCIÓN DE PARQUES</p>	
Equipos requeridos:	11 Brochas, 2 Rodillo, 1 Extensión de rodillo, 2 Repuesto de Rodillo
Observaciones:	Material solicitado a subdirección de parques para mantenimiento

Ejecutó: Abraham Lopez Paz	Cargo: Jefe de Departamento
Supervisó: Ricardo Giovanni Ramos Mastranzo	Cargo: Jefe de Departamento
Autorizó: José Luis Acevedo Hernández	Cargo: Subdirector de Parques

  
 Firma del Ejecutor



  
 Firma del Supervisor

  
 Firma de autorizado

Parque:	CENTRO CÍVICO CULTURAL 5 DE MAYO
Fecha:	02-05-2024
Número:	021-2024

ANEXO FOTOGRÁFICO

Descripción general:	PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRO CÍVICO CULTURAL 5 DE MAYO
----------------------	---

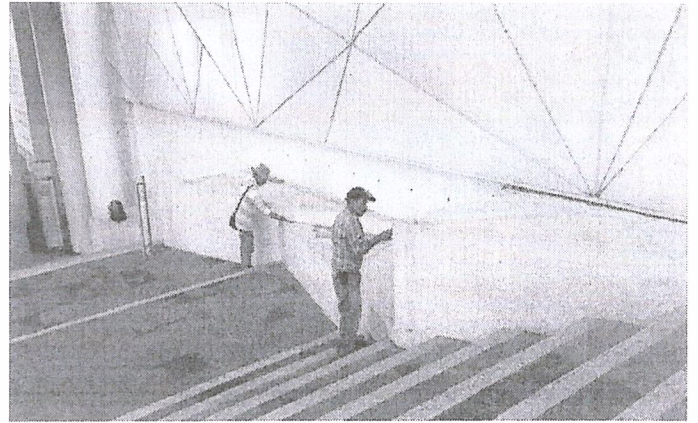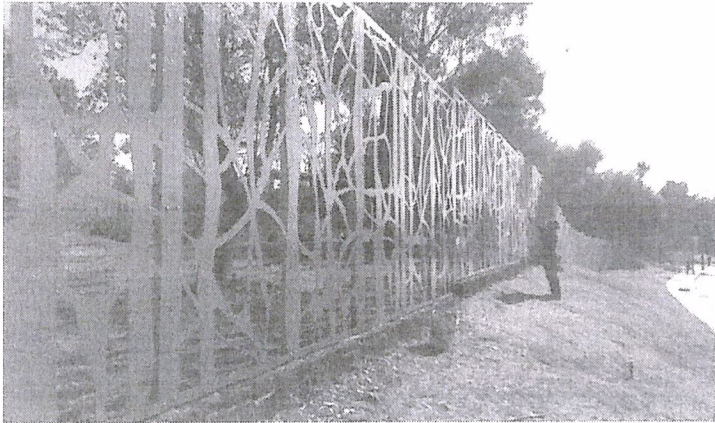

CONVENCIONES  
— Y PARQUES —  
05 MAY 2024  
RECIBIDO  
SUBDIRECCIÓN DE PARQUES

Firma del Ejecutor

Firma del Supervisor

Firma de autorizado


Parque:	CENTRO CÍVICO CULTURAL 5 DE MAYO	
	Fecha:	02-05-2024
	Número:	022-2024

Descripción general:	PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRO CÍVICO CULTURAL 5 DE MAYO
----------------------	---


Responsable de supervisión:	RICARDO GIOVANNI RAMOS MASTRANZO		
Fecha de inicio:	01-04-2024	Fecha de cierre:	30-04-2024

Tareas a Ejecutar	
<ul style="list-style-type: none"><li>Pintura y rehabilitación a 6 piezas de estructura de fútbol de zona de la Familia</li></ul>	
<p><b>CONVENCIONES — Y PARQUES —</b> 05 MAY 2024 <b>RECIBIDO</b> SUBDIRECCIÓN DE PARQUES</p>	
Equipos requeridos:	2 Brochas
Observaciones:	Material solicitado a subdirección de parques para mantenimiento

Ejecutó: Abraham Lopez Paz	Cargo: Jefe de Departamento
Supervisó: Ricardo Giovanni Ramos Mastranzo	Cargo: Jefe de Departamento
Autorizó: José Luis Acevedo Hernández	Cargo: Subdirector de Parques

  
Firma del Ejecutor

  
Firma del Supervisor

  
Firma de autorizado

GOBIERNO DEL  
ESTADO DE PUEBLA

Convenciones  
y Parques

Parque:	CENTRO CÍVICO CULTURAL 5 DE MAYO	
	Fecha:	02-05-2024
	Número:	022-2024

ANEXO FOTOGRÁFICO

Descripción general:	PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRO CÍVICO CULTURAL 5 DE MAYO
----------------------	---



CONVENCIONES  
— Y PARQUES —

05 MAY 2024

RECIBIDO  
SUBDIRECCIÓN DE PARQUES

  
Firma del Ejecutor

  
Firma del Supervisor

  
Firma de autorizado

Parque:	CENTRO CÍVICO CULTURAL 5 DE MAYO	
	Fecha:	03-06-2024
	Número:	027-2024

Descripción general:	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
----------------------	----------------------------

Responsable de supervisión:	RICARDO GIOVANNI RAMOS MASTRANZO		
Fecha de inicio:	01-05-2024	Fecha de cierre:	31-05-2024


Tareas a Ejecutar	
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó la aplicación de pintura en 1,355 metros de guarnición en las áreas de Camellones Centrales, Familia Y Meditación.</li><li>Se realizó el remozamiento de tezontle a 4 jardineras del Parque Centro Cívico Cultural 5 de Mayo.</li><li>Se realizó el remozamiento de grava a 2 jardineras del Parque Centro Cívico Cultural 5 De Mayo.</li></ul>	
Equipos requeridos:	8 pala cuadrada, 2 picos, 3 brochas, 1 rodillo
Observaciones:	Ninguna

CONVENCIONES  
Y PARQUES

04 JUN 2024

RECIBIDO  
SUBDIRECCIÓN DE PARQUES


Ejecutó: Abraham Lopez Paz	Cargo: Jefe de Departamento
Supervisó: Ricardo Giovanni Ramos Mastranzo	Cargo: Jefe de Departamento
Autorizó: José Luis Acevedo Hernández	Cargo: Subdirector de Parques



Firma del Ejecutor



Firma del Supervisor



Firma de autorizado

Parque:	CENTRO CÍVICO CULTURAL 5 DE MAYO	
	Fecha:	03-06-2024
	Número:	027-2024

ANEXO FOTOGRÁFICO

Descripción general:	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
----------------------	----------------------------




CONVENCIONES  
— Y PARQUES —

04 JUN 2024

RECIBIDO  
SUBDIRECCIÓN DE PARQUES

  
Firma del Ejecutor

  
Firma del Supervisor

  
Firma de autorizado



Convenciones  
y Parques

Parque:	<b>CENTRO CÍVICO CULTURAL 5 DE MAYO</b>	
	Fecha:	<b>24-06-2024</b>
	Número:	<b>029-2024</b>

Descripción general:	<b>MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b>
----------------------	-----------------------------------

Responsable de supervisión:	<b>RICARDO GIOVANNI RAMOS MASTRANZO</b>		
Fecha de inicio:	<b>01-06-2024</b>	Fecha de cierre:	<b>21-06-2024</b>

Tareas a Ejecutar	
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó el mantenimiento en pintura a 40 botes de basura, barandales, miradores, rampas de madera, estructuras de señalización, caseta de vigilancia y el exterior del estacionamiento del área de Aventura Extrema</li></ul>	
<b>CONVENCIONES — Y PARQUES —</b> 24 JUN 2024	
Equipos requeridos:	3 brochas, 8 rodillos chicos, 4 rodillos grandes
Observaciones:	Ninguna

**RECIBIDO**  
SUBDIRECCIÓN DE PARQUES

Ejecutó: <b>Abraham Lopez Paz</b>	Cargo: <b>Jefe de Departamento</b>
Supervisó: <b>Ricardo Giovanni Ramos Mastranzo</b>	Cargo: <b>Jefe de Departamento</b>
Autorizó: <b>José Luis Acevedo Hernández</b>	Cargo: <b>Subdirector de Parques</b>

Firma del Ejecutor



Firma del Supervisor

Firma de autorizado

Parque:	<b>CENTRO CÍVICO CULTURAL 5 DE MAYO</b>	
	Fecha:	<b>24-06-2024</b>
	Número:	<b>029-2024</b>

**ANEXO FOTOGRÁFICO**



Descripción general:	<b>MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b>
----------------------	-----------------------------------

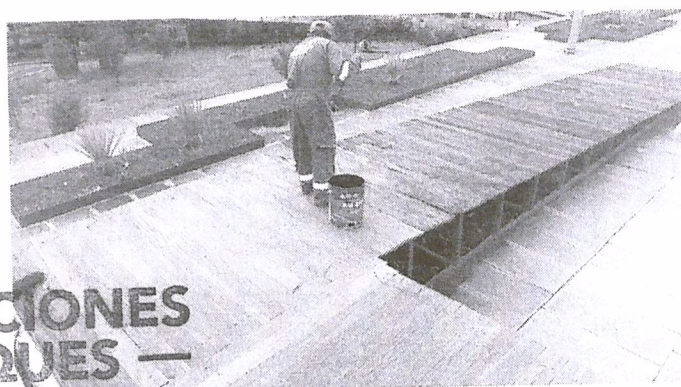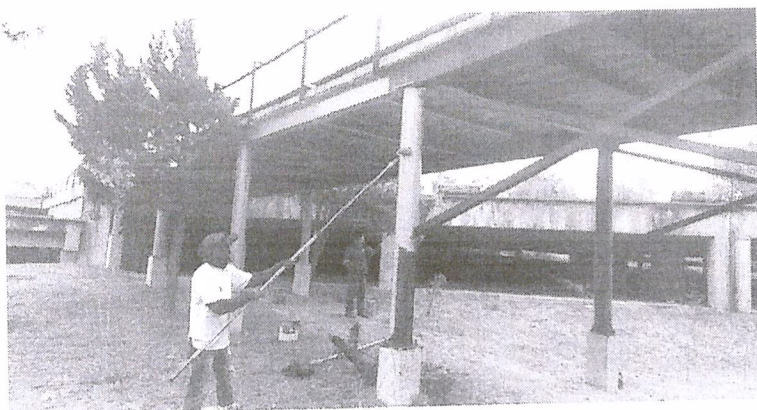


**CONVENCIONES  
— Y PARQUES —**

24 JUN 2024


**RECIBIDO**  
SUBDIRECCIÓN DE PARQUES

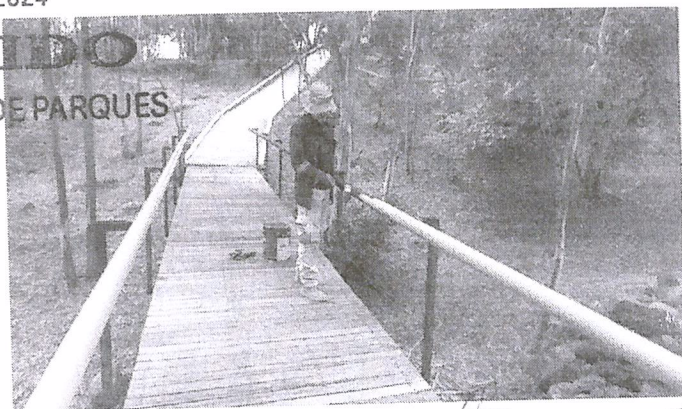Firma del Ejecutor



Firma del Supervisor



Firma de autorizado


Parque:	PASEO DEL TELEFÉRICO		
	Fecha:	02-05-2024	
	Número:	023-2024	

Descripción general:	PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO DEL TELEFÉRICO		
----------------------	---	--	--


Responsable de supervisión:	RICARDO GIOVANNI RAMOS MASTRANZO		
Fecha de inicio:	01-04-2024	Fecha de cierre:	30-04-2024

Tareas a Ejecutar	
<ul style="list-style-type: none"><li>Pintura y rehabilitación a 9 metros cuadrados de barda de Paseo del Teleférico</li></ul>	
<p><b>CONVENCIONES — Y PARQUES —</b> 05 MAY 2024 <b>RECIBIDO</b> SUBDIRECCIÓN DE PARQUES</p>	
Equipos requeridos:	1 Brocha
Observaciones:	Material solicitado a subdirección de parques para mantenimiento

Ejecutó: Abraham Lopez Paz	Cargo: Jefe de Departamento
Supervisó: Ricardo Giovanni Ramos Mastranzo	Cargo: Jefe de Departamento
Autorizó: José Luis Acevedo Hernández	Cargo: Subdirector de Parques

  
Firma del Ejecutor

  
Firma del Supervisor

  
Firma de autorizado

GOBIERNO DEL  
ESTADO DE PUEBLA

Convenciones  
y Parques

Parque:	PASEO DEL TELEFÉRICO	
	Fecha:	02-05-2024
	Número:	023-2024

ANEXO FOTOGRÁFICO

Descripción general:	PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO DEL TELEFÉRICO
----------------------	---



CONVENCIONES  
— Y PARQUES —  
05 MAY 2024  
RECIBIDO  
SUBDIRECCIÓN DE PARQUES

  
Firma del Ejecutor

  
Firma del Supervisor

  
Firma de autorizado

Parque:	PARQUE DEL ARTE
Fecha:	03/06/2024
Número:	011-2024

Descripción General:	Mantenimiento de pintura en andador central y palapas del Parque del Arte
----------------------	---

Responsable de supervisión:	Bárbara Rodríguez Mundo		
Fecha de inicio:	01-05-2024	Fecha de cierre:	31-05-2024

**Tareas a Ejecutar**

**Mantenimiento de pintura**

Se llevaron a cabo los siguientes trabajos de pintura en el Parque del Arte, pintura en pavimento del andador central dando un total de 1,372 metros cuadrados y mantenimiento de pintura a 20 palapas.

CONVENCIONES  
Y PARQUES

04 JUN 2024

RECIBIDO

SUBDIRECCIÓN DE PARQUES

Equipos requeridos:	2 Rodillos, 2 brochas y thinner
Observaciones:	

Ejecutó: Armando Formacio Xicale	Cargo: Encargado de Mantenimiento
Supervisó: Bárbara Rodríguez Mundo	Cargo: Encargado del Parque
Validó: Jose Luis Acevedo Hernández	Cargo: Subdirector de Parques

Firma del Ejecutor



Firma del Supervisor

Firma de autorizado

Parque:	PARQUE DEL ARTE	
	Fecha:	03/06/2024
	Número:	011-2024

ANEXO FOTOGRÁFICO

Descripción general:	Mantenimiento de pintura en pasillo del domo y palapas del Parque del Arte
----------------------	--

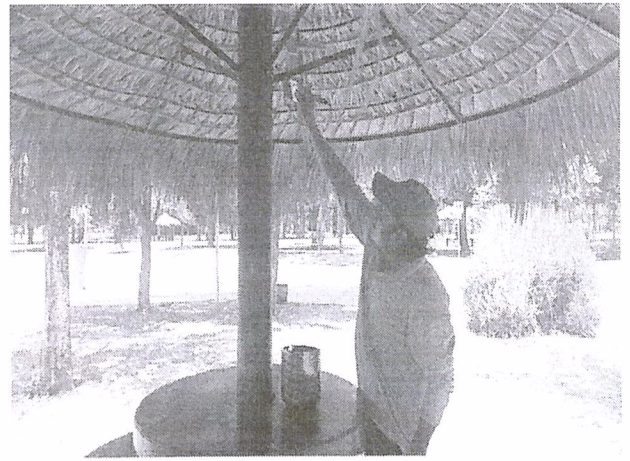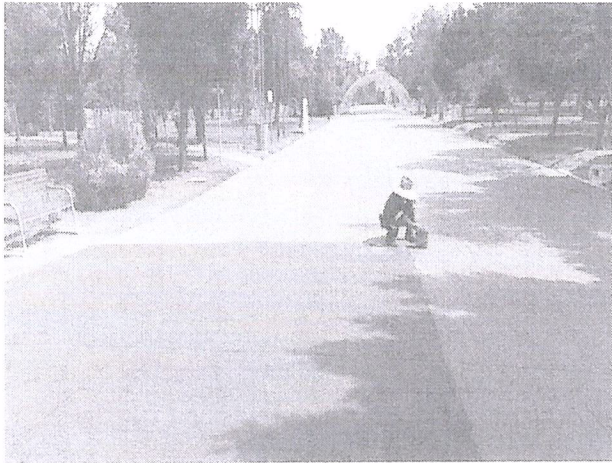

**CONVENCIONES  
— Y PARQUES —**

04 JUN 2024

**RECIBIDO**  
SUBDIRECCIÓN DE PARQUES

Firma del Ejecutor

Firma del Supervisor

Firma de autorizado

Parque:	Parque Ecológico	
	Fecha:	03-06-2024
	Número:	014/2024

Descripción general:	Mantenimiento de Inmuebles del Parque Ecológico
----------------------	---

Responsable de supervisión:	Javier Vázquez Cisneros		
Fecha de inicio:	01-05-2024	Fecha de cierre:	31-05-2024

Tareas a Ejecutar	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Se realizó el repintado de 156 bancas de madera y metal en las zonas de: orilla de lago, canchas de usos múltiples, juegos infantiles, acceso 1 a italian coffee y tiro con arco.</li><li>- Se realizó el repintado de 95 palapas de concreto de las siguientes zonas: acceso 1 a skate park, parque alianza, teatro foro, tirolesa y canchas de usos múltiple.</li></ul>	
<p><b>CONVENCIONES — Y PARQUES —</b> n 4 JUN 2024 <b>RECIBIDO</b> SUBDIRECCIÓN DE PARQUES</p>	
Equipos requeridos:	Brochas, rodillos y pintura.
Observaciones:	

Ejecutó : Ángel Zepeda Sanchez	Cargo: Analista
Supervisó: Javier Vázquez Cisneros	Cargo: Jefe de Departamento
Validó: José Luis Acevedo Hernández	Cargo: Subdirector de Parques

  
Firma del Ejecutor

  
Firma del Supervisor

  
Firma de autorizado

# CONVENCIONES — Y PARQUES —

04 JUN 2024

## RECIBIDO

SUBDIRECCIÓN DE PARQUES

Parque:	Parque Ecológico	
	Fecha:	03-06-2024
	Número:	014/2024

Descripción general:	Mantenimiento de Inmuebles del Parque Ecológico
----------------------	---

Responsable de supervisión:	Javier Vázquez Cisneros
-----------------------------	-------------------------

Fecha de inicio:	01-05-2024	Fecha de cierre:	31-05-2024
------------------	------------	------------------	------------



Firma del Ejecutor

Firma del Supervisor

Firma de autorizado

Parque:	METROPOLITANO	
	Fecha:	3-06-2024
	Número:	017-2024

Descripción general:	Mantenimiento.
----------------------	----------------

Responsable de supervisión:	Luis Antonio Mejía Urrutia		
Fecha de inicio:	1-05-2024	Fecha de cierre:	31-05-2024

Tareas a Ejecutar	
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizo la pintura de los pilares bajo puente de la Avenida Cúmulo de Virgo en Playón de la Playa.</li></ul>	
<p><b>CONVENCIONES — Y PARQUES —</b> 04 JUN 2024 <b>RECIBIDO</b> SUBDIRECCIÓN DE PARQUES</p>	
Equipos requeridos:	N/A
Observaciones:	Sin observaciones

Ejecuto: José Antonio García Paz	Cargo: Encargado de Mantenimiento
Superviso: Luis Antonio Mejía Urrutia.	Cargo: Encargado del Parque
Valida: Jose Luis Acevedo Hernández	Cargo: Subdirector de Parques

  
Firma del Ejecutor

  
Firma del Supervisor

  
Firma de autorizado

Parque:	METROPOLITANO
Fecha:	3-06-2024
Número:	017-2024

**ANEXO FOTOGRÁFICO**

Descripción general:	ACCIÓN A REALIZAR
----------------------	-------------------



**CONVENCIONES  
— Y PARQUES —**

11 de JUN 2024

**RECIBIDO  
SUBDIRECCIÓN DE PARQUES**

  
Firma del Ejecutor

  
Firma del Supervisor

  
Firma de autorizado


Parque:	<b>METROPOLITANO</b>	
Fecha:	<b>24-06-2024</b>	
Número:	<b>022-2024</b>	

Descripción general:	<b>Mantenimiento de inmuebles.</b>
----------------------	------------------------------------


Responsable de supervisión:	<b>Luis Antonio Mejía Urrutia</b>		
Fecha de inicio:	<b>1-06-2024</b>	Fecha de cierre:	<b>21-06-2024</b>

<b>Tareas Ejecutadas</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizo la pintura de reja de la cancha de fútbol 7.</li> </ul>	
<p><b>CONVENCIONES — Y PARQUES</b></p> <p>24 JUN 2024</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>SUBDIRECCIÓN DE PARQUES</p>	
Equipos requeridos:	<b>N/A</b>
Observaciones:	<b>Sin observaciones</b>


Ejecuto: José Antonio García Paz	Cargo: <b>Encargado de Mantenimiento</b>
Superviso: Luis Antonio Mejía Urrutia.	Cargo: <b>Encargado del Parque</b>
Validó: <b>Jose Luis Acevedo Hernández</b>	Cargo: <b>Subdirector de Parques</b>



**Firma del Ejecutor**



**Firma del Supervisor**




**Firma de autorizado**

Parque:	<b>METROPOLITANO</b>	
	Fecha:	<b>24-06-2024</b>
	Número:	<b>022-2024</b>

**ANEXO FOTOGRÁFICO**

Descripción general:	<b>ACCIONES REALIZADAS</b>
----------------------	----------------------------

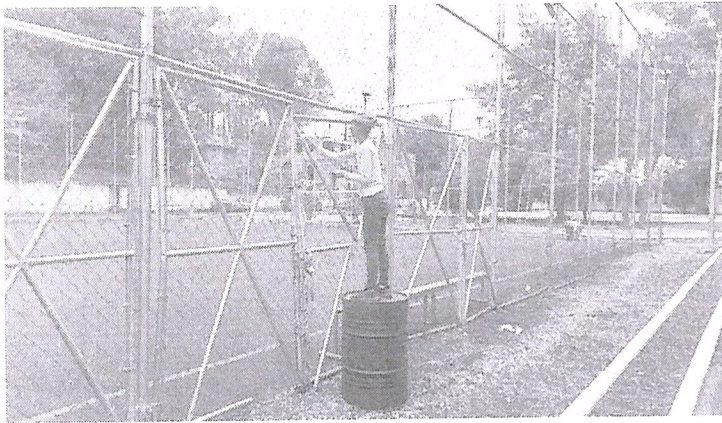

**CONVENCIONES  
— Y PARQUES —**

24 JUN 2024

**RECIBIDO**  
SUBDIRECCIÓN DE PARQUES

**Firma del Ejecutor**

**Firma del Supervisor**

**Firma de autorizado**


Parque:	<b>METROPOLITANO</b>	
	Fecha:	<b>24-06-2024</b>
	Número:	<b>023-2024</b>

Descripción general:	<b>Mantenimiento de inmuebles.</b>
----------------------	------------------------------------


Responsable de supervisión:	<b>Luis Antonio Mejía Urrutia</b>		
Fecha de inicio:	<b>1-06-2024</b>	Fecha de cierre:	<b>21-06-2024</b>

<b>Tareas Ejecutadas</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se llevo a cabo el mantenimiento con aplicación de pintura en las estructuras decorativas del Playón de Laberintos.</li> </ul>	
<p><b>CONVENCIONES — Y PARQUES —</b></p> <p>24 JUN 2024</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>SUBDIRECCIÓN DE PARQUES</p>	
Equipos requeridos:	<b>N/A</b>
Observaciones:	<b>Sin observaciones</b>


Ejecuto: José Antonio García Paz	Cargo: <b>Encargado de Mantenimiento</b>
Superviso: Luis Antonio Mejía Urrutia.	Cargo: <b>Encargado del Parque</b>
Validó: <b>Jose Luis Acevedo Hernández</b>	Cargo: <b>Subdirector de Parques</b>



**Firma del Ejecutor**



**Firma del Supervisor**





**Firma de autorizado**

Parque:	<b>METROPOLITANO</b>	
	Fecha:	<b>24-06-2024</b>
	Número:	<b>023-2024</b>

**ANEXO FOTOGRÁFICO**

Descripción general:	<b>ACCIONES REALIZADAS</b>
----------------------	----------------------------

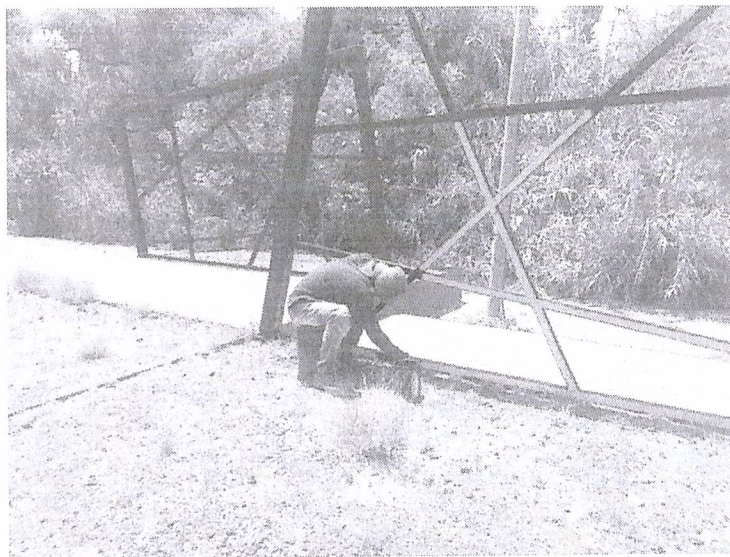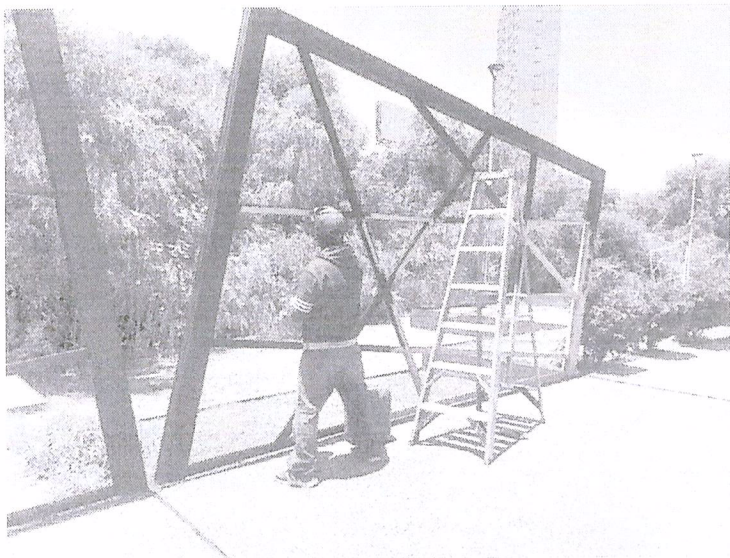

**CONVENCIONES  
— Y PARQUES —**

24 JUN 2024

**RECIBIDO**  
SUBDIRECCIÓN DE PARQUES

Firma del Ejecutor

Firma del Supervisor

Firma de autorizado


Parque:	<b>METROPOLITANO</b>	
Fecha:	<b>24-06-2024</b>	
Número:	<b>024-2024</b>	

Descripción general:	<b>Mantenimiento de inmuebles.</b>
----------------------	------------------------------------


Responsable de supervisión:	<b>Luis Antonio Mejía Urrutia</b>		
Fecha de inicio:	<b>1-06-2024</b>	Fecha de cierre:	<b>21-06-2024</b>

Tareas Ejecutadas	
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizo el retoque de 950 metros cuadrados de las tablas del puente de Playón del Agua.</li></ul>	
<p><b>CONVENCIONES — Y PARQUES —</b> 24 JUN 2024 <b>RECIBIDO</b> SUBDIRECCIÓN DE PARQUES</p>	
Equipos requeridos:	<b>N/A</b>
Observaciones:	<b>Sin observaciones</b>


Ejecuto: José Antonio García Paz	Cargo: <b>Encargado de Mantenimiento</b>
Superviso: Luis Antonio Mejía Urrutia.	Cargo: <b>Encargado del Parque</b>
Validó: <b>Jose Luis Acevedo Hernández</b>	Cargo: <b>Subdirector de Parques</b>



**Firma del Ejecutor**



**Firma del Supervisor**



**Firma de autorizado**

Parque:	METROPOLITANO SAN JOSE CHIAPA	
	Fecha:	02-05-2024
	Número:	012-2024

Descripción general:	Aplicación de pintura en Parque Metropolitano San José Chiapa
----------------------	---

Responsable de supervisión:	Celestino Aparicio Martínez		
Fecha de inicio:	1-04-2024	Fecha de cierre:	30-04-2024

#### Tareas a Ejecutar

- 1 al 15 de abril. Aplicación de pintura esmalte en 17.21 metros cuadrados en puertas de baños y oficina, aplicación de pintura esmalte en 35.56 metros cuadrados de placas de acero de fuentes lúdicas, aplicación de pintura esmalte en 6 metros cuadrados de tapas de cisternas en fuente Obelisco y Parque Zócalo, aplicación de pintura esmalte en 30.73 metros cuadrados de rejillas de colectores pluviales en Parque Metropolitano y Zócalo.
- 15 al 30 de abril. Aplicación de pintura esmalte en 62.5 metros cuadrados de tótems y mamparas informativas en parque Zócalo, aplicación de pintura esmalte en 64 metros cuadrados de estructura metálica de palillos de Parque Metropolitano.

Dando un total de 218 metros cuadrados de aplicación de pintura esmalte.

CONVENCIONES  
— Y PARQUES —

05 MAY 2024

Equipos requeridos:

1 generador de energía eléctrica, 1 compresora.

RECIBIDO  
SUBDIRECCIÓN DE PARQUES

Observaciones:

Ejecuta: Cristina Arroyo Hernández	Cargo: Encargado de Mantenimiento
Supervisa: Celestino Aparicio Martínez	Cargo: Encargado del Parque
Valida: Jose Luis Acevedo Hernández	Cargo: Subdirector de Parques


  
Firma del Ejecutor

  
Firma del Supervisor

  
Firma de autorizado

METROPOLITANO SAN JOSE CHIAPA	
Fecha:	02-05-2024
Número:	012-2024

ANEXO FOTOGRÁFICO

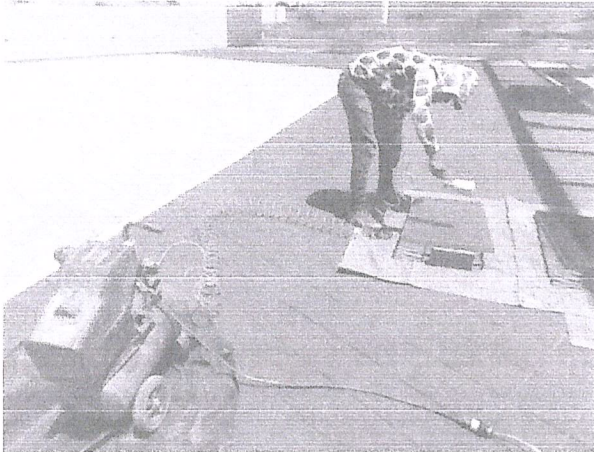

CONVENCIONES  
Y PARQUES  
05 MAY 2024  
SUBDIRECCION DE PARQUES

Firma del Ejecutor

Firma del Supervisor

Firma de autorizado

Parque:	METROPOLITANO SAN JOSÉ CHIAPA
Fecha:	03-06-2024
Número:	015-2024

Descripción general:	Aplicación de pintura en Parque Metropolitano San José Chiapa
----------------------	---

Responsable de supervisión:	Celestino Aparicio Martínez		
Fecha de inicio:	01-05-2024	Fecha de cierre:	31-05-2024

Tareas a Ejecutar	
<ul style="list-style-type: none"><li>1 al 6 de mayo. Aplicación de pintura esmalte en 64 metros cuadrados de estructura metálica de palillos de Parque Metropolitano.</li><li>7 al 17 de mayo. Aplicación de pintura esmalte en 84.3 metros cuadrados en caseta comercial de Parque Lineal 4 zona IPN.</li><li>18 al 24 de mayo. Aplicación de pintura esmalte en 42.15 metros cuadrados en exterior de caseta comercial de Parque Lineal zona BUAP.</li><li>25 al 31 de mayo. Aplicación de pintura esmalte en 38 metros cuadrados en exterior de caseta comercial de Parque Lineal 6.</li></ul> <p>Dando un total de 228.45 metros cuadrados de aplicación de pintura esmalte.</p>	
Equipos requeridos:	1 generador de energía eléctrica, 1 compresora
Observaciones:	

**CONVENCIONES  
— Y PARQUES —**

04 JUN 2024

**RECIBIDO**  
SUBDIRECCIÓN DE PARQUES

Ejecutó: <b>Cristina Arroyo Hernández</b>	Cargo: <b>Encargado de Mantenimiento</b>
Supervisó: <b>Celestino Aparicio Martínez</b>	Cargo: <b>Encargado del Parque</b>
Validó: <b>José Luis Acevedo Hernández</b>	Cargo: <b>Subdirector de Parques</b>




Firma del Ejecutor

Firma del Supervisor


Firma de autorizado

METROPOLITANO SAN JOSÉ CHIAPA	
Fecha:	03-06-2024
Número:	015-2024

ANEXO FOTOGRÁFICO

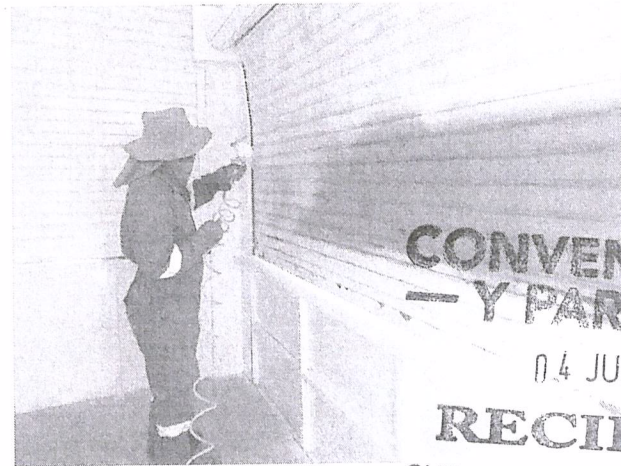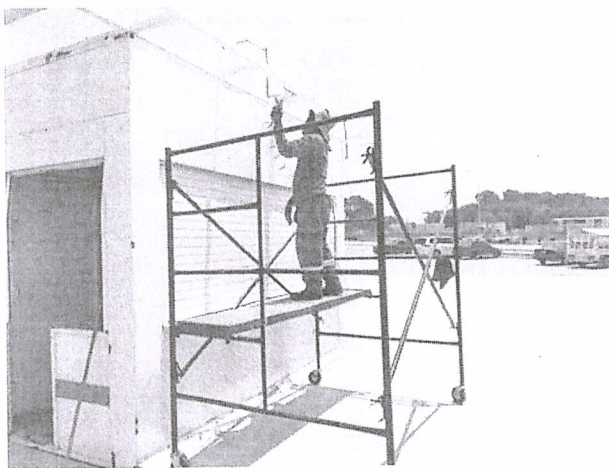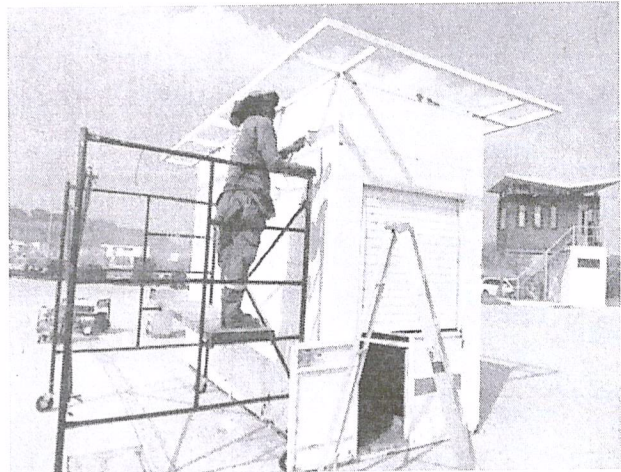

CONVENCIONES  
Y PARQUES  
04 JUN 2024  
RECIBIDO  
SUBDIRECCIÓN DE PARQUES

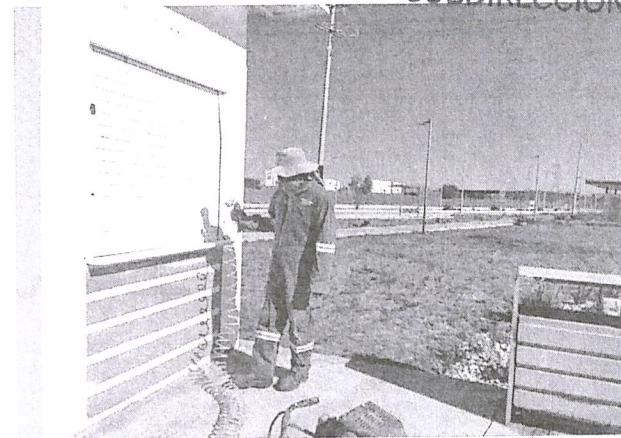

Firma del Ejecutor

Firma del Supervisor

Firma de autorizado



Convenciones  
y Parques

Parque:	METROPOLITANO SAN JOSÉ CHIAPA	
	Fecha:	24-06-2024
	Número:	017-2024

Descripción general:	Aplicación de pintura en Parque Metropolitano San José Chiapa
----------------------	---

Responsable de supervisión:	Celestino Aparicio Martínez		
Fecha de inicio:	01-06-2024	Fecha de cierre:	21-06-2024

### Tareas Ejecutadas

- 1 al 11 de junio. Se aplicó pintura esmalte en 46.3 metros cuadrados en interior de caseta comercial de Parque Lineal 6.
- 12 al 21 de junio. Se aplicó pintura esmalte en 35.1 metros cuadrados en exterior de caseta comercial de Parque Lineal 9.

Dando un total de 81.4 metros cuadrados de aplicación de pintura esmalte.

**CONVENCIONES  
— Y PARQUES —**

24 JUN 2024

**RECIBIDO**

SUBDIRECCIÓN DE PARQUES

Equipos requeridos:	1 generador de energía eléctrica, 1 compresora
Observaciones:	

Ejecutó: <b>Cristina Arroyo Hernández</b>	Cargo: <b>Encargado de Mantenimiento</b>
Supervisó: <b>Celestino Aparicio Martínez</b>	Cargo: <b>Encargado del Parque</b>
Validó: <b>José Luis Acevedo Hernández</b>	Cargo: <b>Subdirector de Parques</b>

Firma del Ejecutor

Firma del Supervisor

Firma de autorizado

Parque:	METROPOLITANO
Fecha:	3-06-2024
Número:	020-2024

Descripción general:	Mantenimiento
----------------------	---------------

Responsable de supervisión:	Luis Antonio Mejía Urrutia		
Fecha de inicio:	1-05-2024	Fecha de cierre:	31-05-2024

Tareas a Ejecutar	
<ul style="list-style-type: none"><li>Rehabilitación de cisterna de escultura Gotas de Vida</li></ul>	
<p><b>CONVENCIONES — Y PARQUES —</b> 11 JUN 2024 <b>RECIBIDO</b> SUBDIRECCIÓN DE PARQUES</p>	
Equipos requeridos:	n/a
Observaciones:	Sin observaciones

Ejecutó: José Antonio García Paz	Cargo: Encargado de Mantenimiento
Supervisó: Luis Antonio Mejía Urrutia.	Cargo: Encargado del Parque
Validó: Jose Luis Acevedo Hernández	Cargo: Subdirector de Parques

  
Firma del Ejecutor

  
Firma del Supervisor

  
Firma de autorizado

Parque:	PARQUE FLOR DEL BOSQUE	
	Fecha:	02-05-2024
	Número:	0012-2024

Descripción general:	APLICACIÓN DE BARNIZ A CABAÑAS ECOLÓGICAS 2,3 Y 4		
----------------------	---	--	--

Responsable de supervisión:	ELOISA REYES MELÉNDEZ		
Fecha de inicio:	01-04-2024	Fecha de cierre:	30-04-2024

**Tareas a Ejecutar**

- Del 01 al 12 de abril de 2024. Se realizaron actividades de aplicación de barniz a cabaña ecológica # 3, abarcando un aproximado de 350 metros cuadrados.
- Del 13 al 22 de abril de 2024. Se realizó la aplicación de barniz a cabaña ecológica # 4, abarcando un aproximado de 350 metros cuadrados.
- Del 23 al 30 de abril de 2024. Se realizó la aplicación de barniz a cabaña ecológica # 2, abarcando un aproximado de 350 metros cuadrados.

CONVENCIONES  
— Y PARQUES —

05 MAY 2024

RECIBIDO

SUBDIRECCIÓN DE PARQUES

Equipos requeridos:	6 Personas para realizar el trabajo, barniz, catalizador, thinner, tijas, estopa, brochas, rodillos y andamios.
Observaciones:	Se realizo la aplicación de barniz para la mejora de la madera de las cabañas ecológicas.


Ejecuta: Erasmo Santiago Aguilar Galindo	Cargo: Encargado de Mantenimiento
Supervisar: Eloisa Reyes Meléndez	Cargo: Encargado del Parque
Valida: Jose Luis Acevedo Hernández	Cargo: Subdirector de Parques



Firma del Ejecutor



Firma del Supervisor





Firma de autorizado

Parque:	PARQUE FLOR DEL BOSQUE	
	Fecha:	02-05-2024
	Número:	012-2024

ANEXO FOTOGRÁFICO

Descripción general:	APLICACIÓN DE BARNIZ A CABAÑA 2, 3 Y 4
----------------------	--

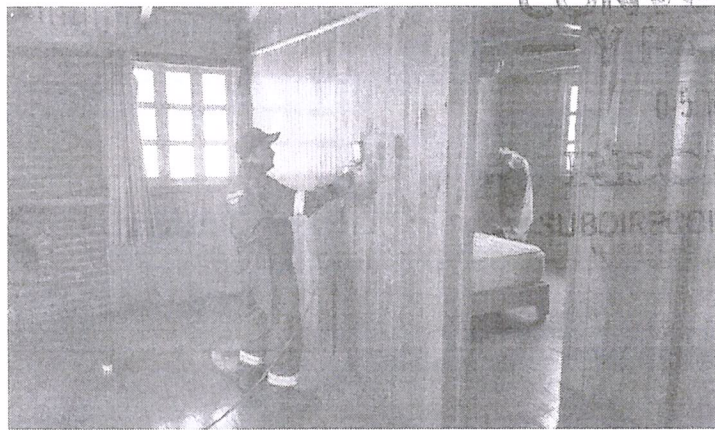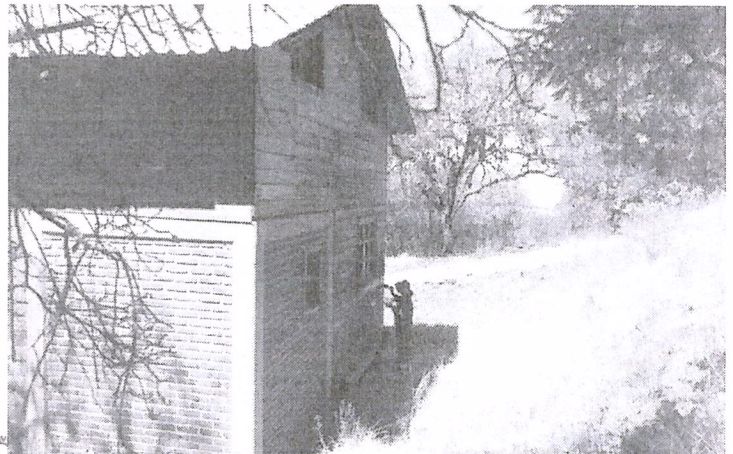

Firma del Ejecutor


Firma del Supervisor

Firma de autorizado


Parque:	Parque Metropolitano	
Fecha:	01-07-2024	
Número:	006	

Descripción general:	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS VINTAGE EN PÉRGOLAS.
----------------------	--


Responsable de supervisión:	Roman Eduardo Arce Arce		
Fecha de inicio:	22-06-2024	Fecha de cierre:	28-06-2024

Tareas a Ejecutar	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalación de 30 series vintage cálidas en área de prismas.</li> <li>- Instalación de 50 metros de cableado eléctrico.</li> <li>- Instalación de fotocélula de control.</li> </ul>	
	
Equipos requeridos:	Escalera, pinzas, desarmadores, cinta de aislar, multímetro.
Observaciones:	Se mejora la iluminación en área de prismas.


Supervisor: Roman Eduardo Arce Arce	Cargo: Jefe del departamento eléctrico
Ejecutor: Abraham Sanchez Gonzalez	Cargo: Jefe de Sección
Autoriza: Sergio Bobadilla Valencia	Cargo: Subdirector de mantenimiento



Firma del Ejecutor





Firma del Supervisor




Firma de autorizado


Parque:	Parque Metropolitano	
	Fecha:	01-07-2024
	Número:	006

Descripción general:	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS VINTAGE EN PÉRGOLAS.
----------------------	--

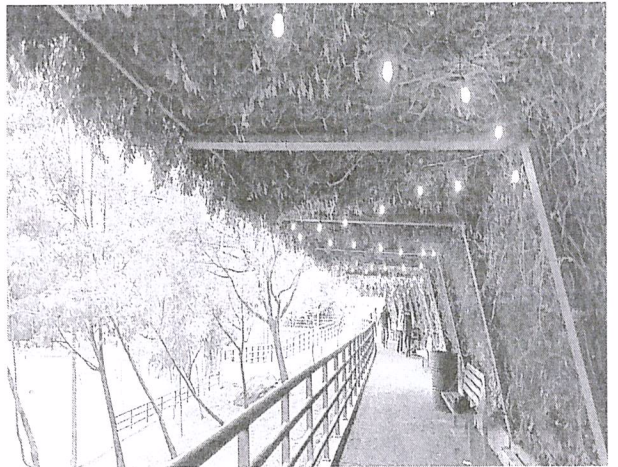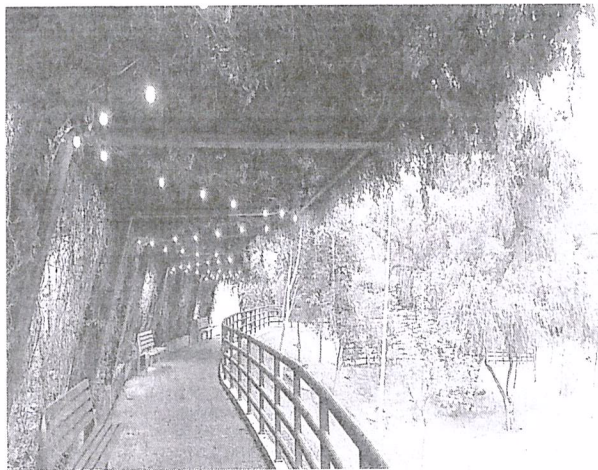


  
\_\_\_\_\_

Firma del Ejecutor

  
\_\_\_\_\_

Firma del Supervisor

  
\_\_\_\_\_

Firma de autorizado

Recinto:

Plaza de toros el Relicario

Fecha:

30-04-2024

Número:

002

Descripción general:

Reemplazo de iluminación en plaza de toros el relicario

Responsable de supervisión:

Roman Eduardo Arce Arce

Fecha de inicio:


04-04-2024

Fecha de cierre:

10-04-2024

Tareas a Ejecutar

- Reemplazo de iluminación fundida.
- retiro de iluminación en mal estado.
- limpieza de difusores y luminarios.
- colocación de más de 100 luminarias nuevas.



Equipos requeridos:

Pinzas de eléctrico, multímetro, juego de desarmadores, cinta aislante, cable, escalera.

Observaciones:

Se deja funcionando correctamente la iluminación

Supervisor: Roman Eduardo Arce Arce

Cargo: Jefe del departamento eléctrico

Ejecutor: Abraham Sánchez González

Cargo: Jefe de sección







Autoriza: Sergio Bobadilla Valencia

Cargo: Subdirector de mantenimiento

Firma del Ejecutor

Firma del Supervisor

Firma de autorizado

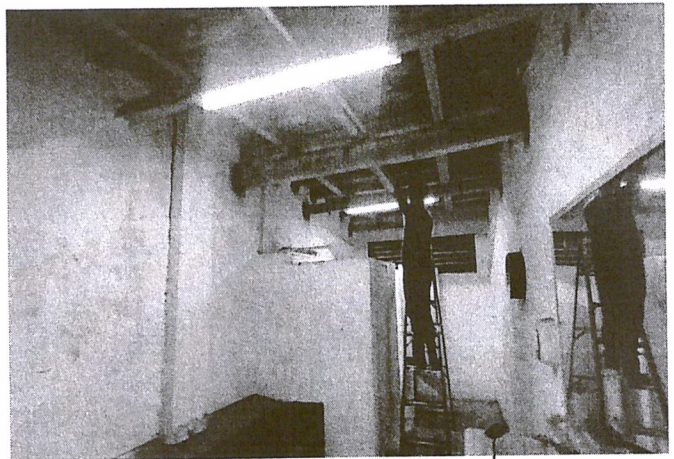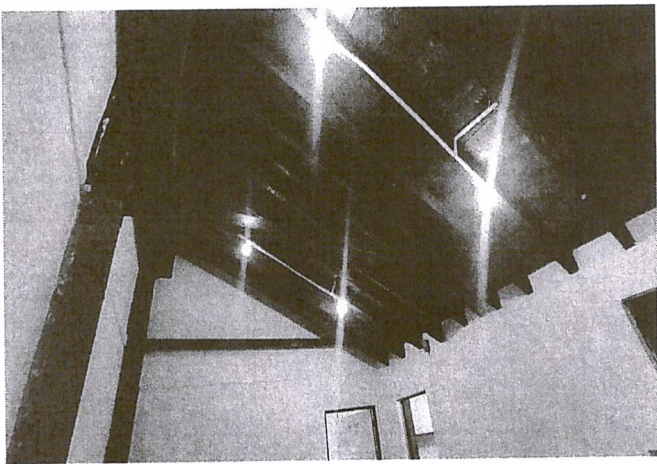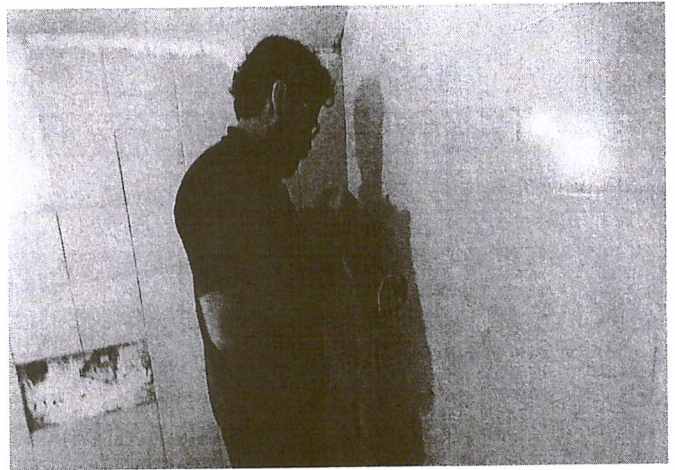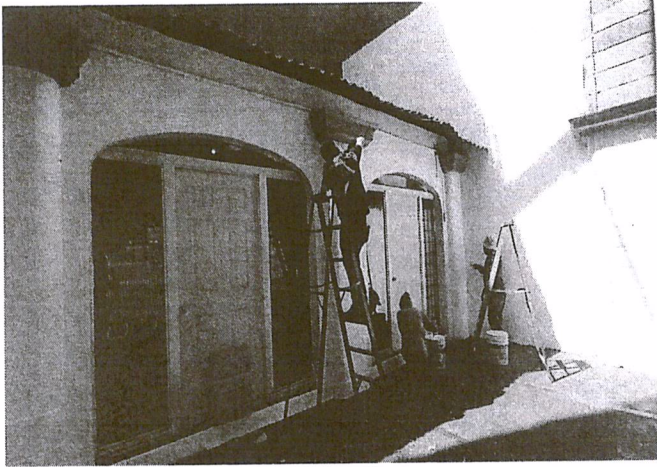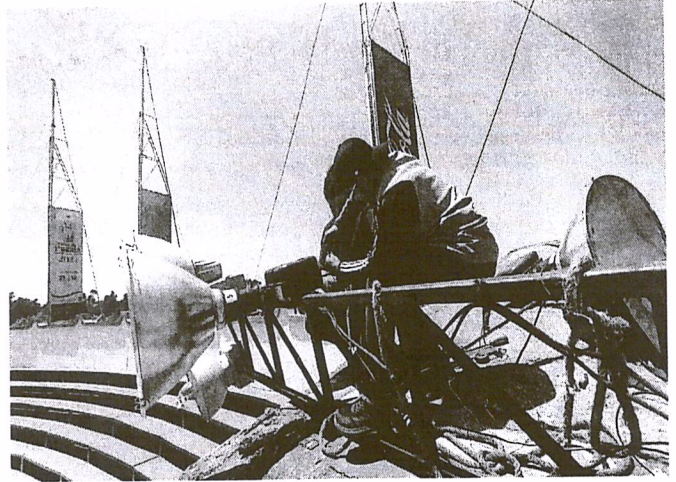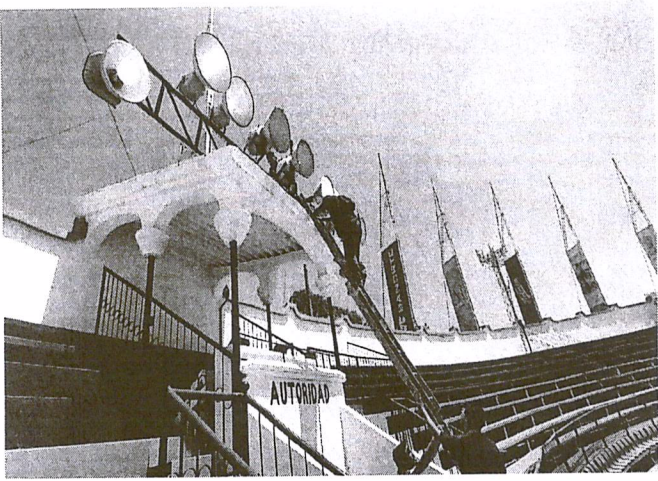


Salvador :

Recinto:	Plaza de Toros el Relicario	
	Fecha:	28-04-2024
	Número:	001

Descripción general:	Se realizó el mantenimiento en los muros interiores y exteriores del recinto y zona de gradas mediante la aplicación de pintura vinílica y esmalte.
----------------------	---

Responsable de supervisión:	Amalia Xicotencatl Petris		
Fecha de inicio:	01-04-2024	Fecha de cierre:	28-04-2024

Tareas a Ejecutar	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Preparación y aplicación de pintura vinílica en 6080 metros cuadrados de muros interiores, exteriores y bardas.</li><li>- Preparación y aplicación de pintura vinílica en 4560 metros cuadrados de muros de fachada exterior y área de corrales.</li><li>- Preparación y aplicación de pintura en 3040 metros cuadrados de pintura esmalte en área de gradas.</li><li>- Preparación y aplicación de pintura en 1520 metros cuadrados de pintura esmalte aplicada en área de puertas de los locales, zona de regaderas, barandales y puertas de toriles y renovación de la pintura de la estructura del reloj</li><li>- Dando un total de 15200 metros cuadrados.</li></ul>	
Equipos requeridos:	90 rodillos de 9", 30 rodillos de 4", 60 brochas de 4"
Observaciones:	Actividad crucial para mejorar la estética de los espacios, proteger las superficies contra daños y prolongar su vida útil.




Supervisor: Amalia Xicotencatl Petris	Cargo: Jefe de Departamento
Ejecutor: Julián Osorio Medrano	Cargo: Jefe de Mantenimiento
Autoriza: Sergio Bobadilla Valencia	Cargo: Subdirector de Mantenimiento



Firma del Solicitante

Firma del Supervisor



Firma de autorizado

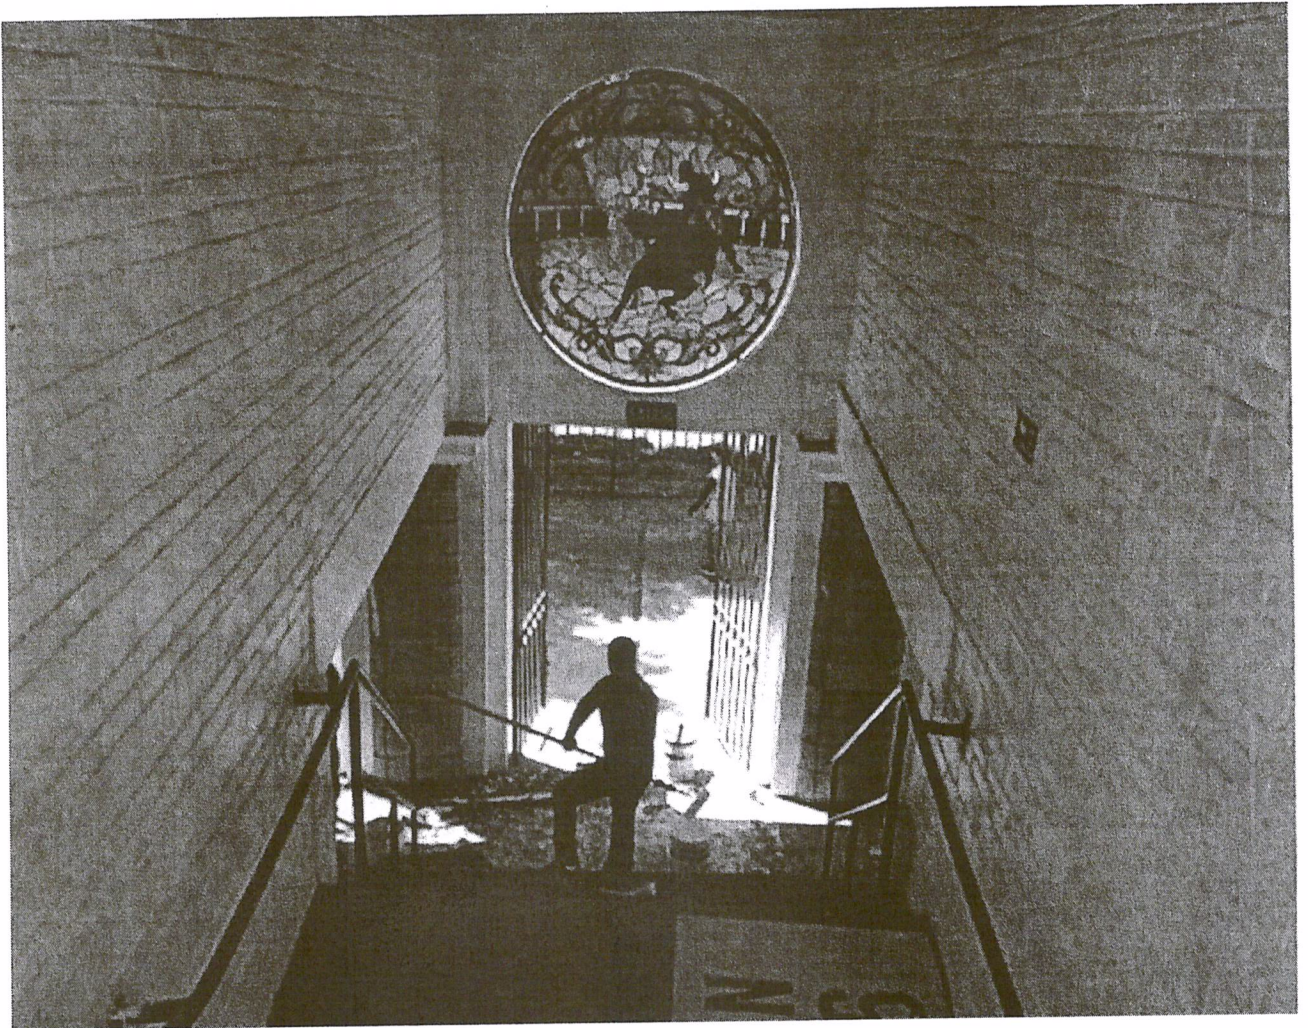

*Handwritten signature or mark.*

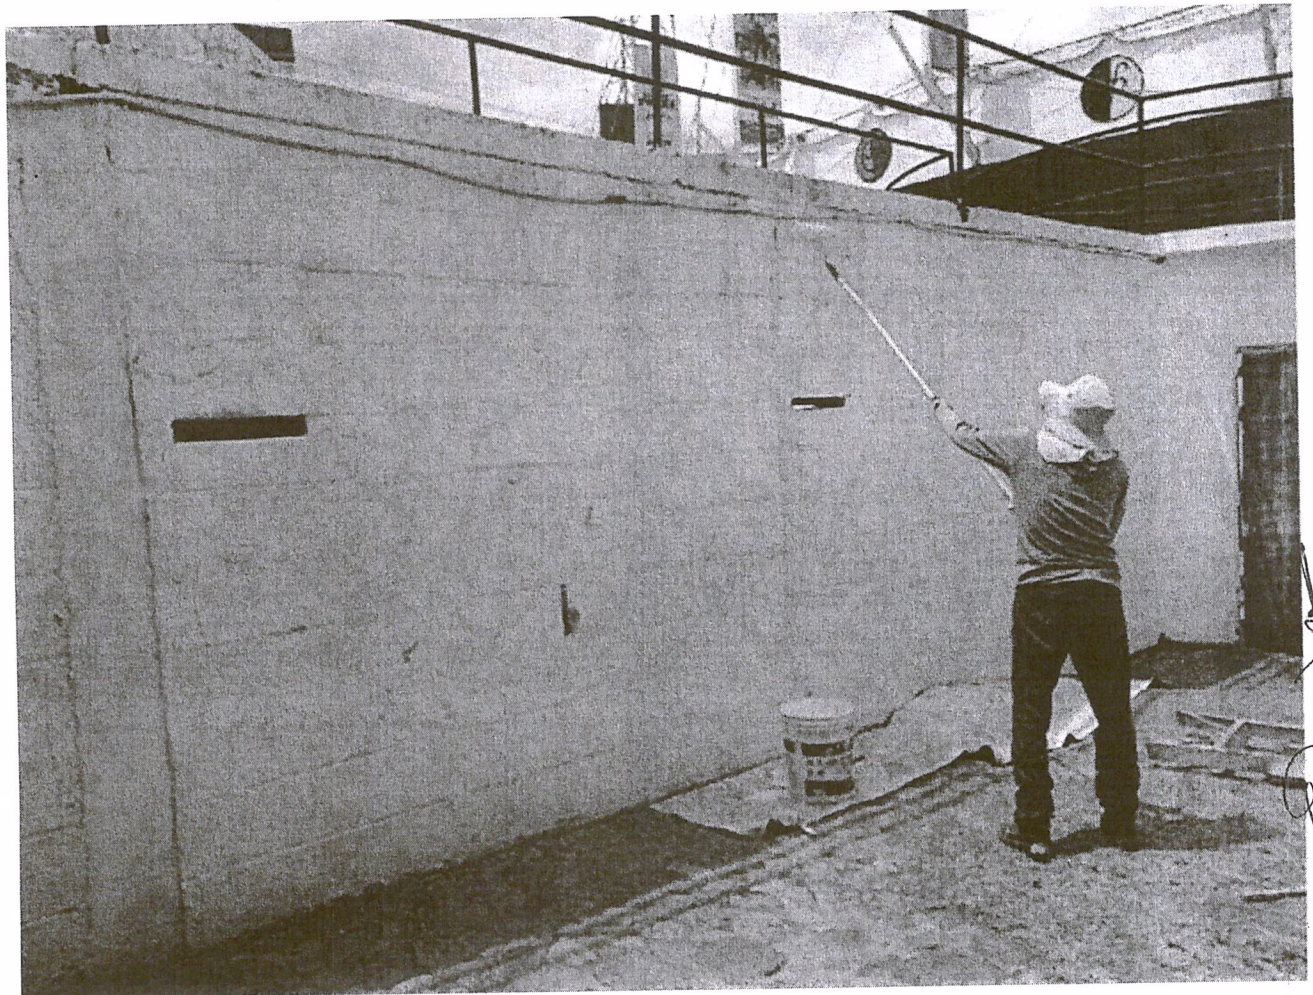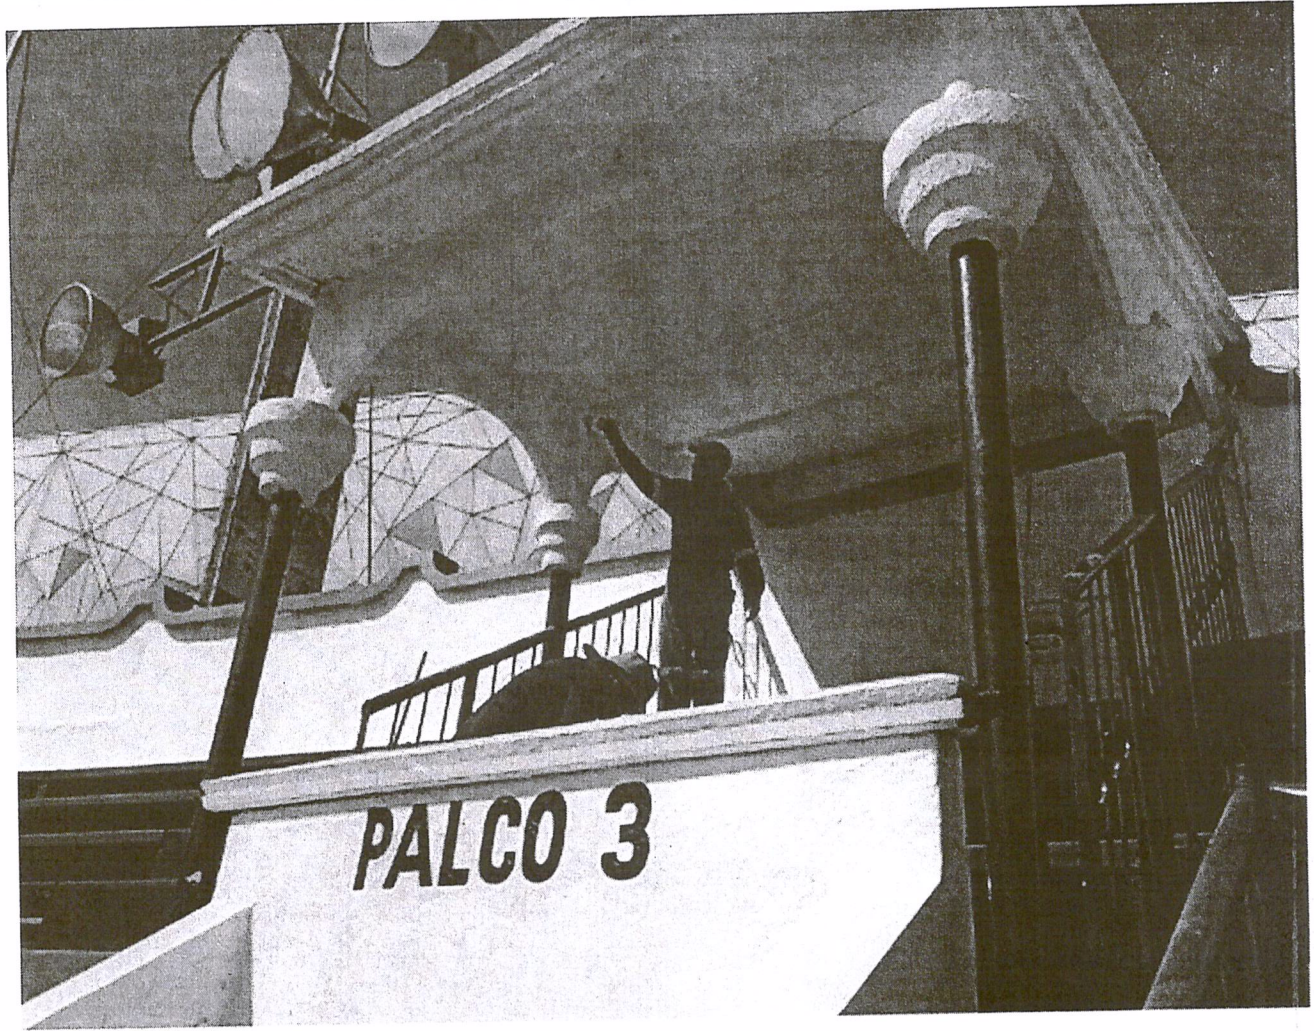



*Handwritten signature or mark.*

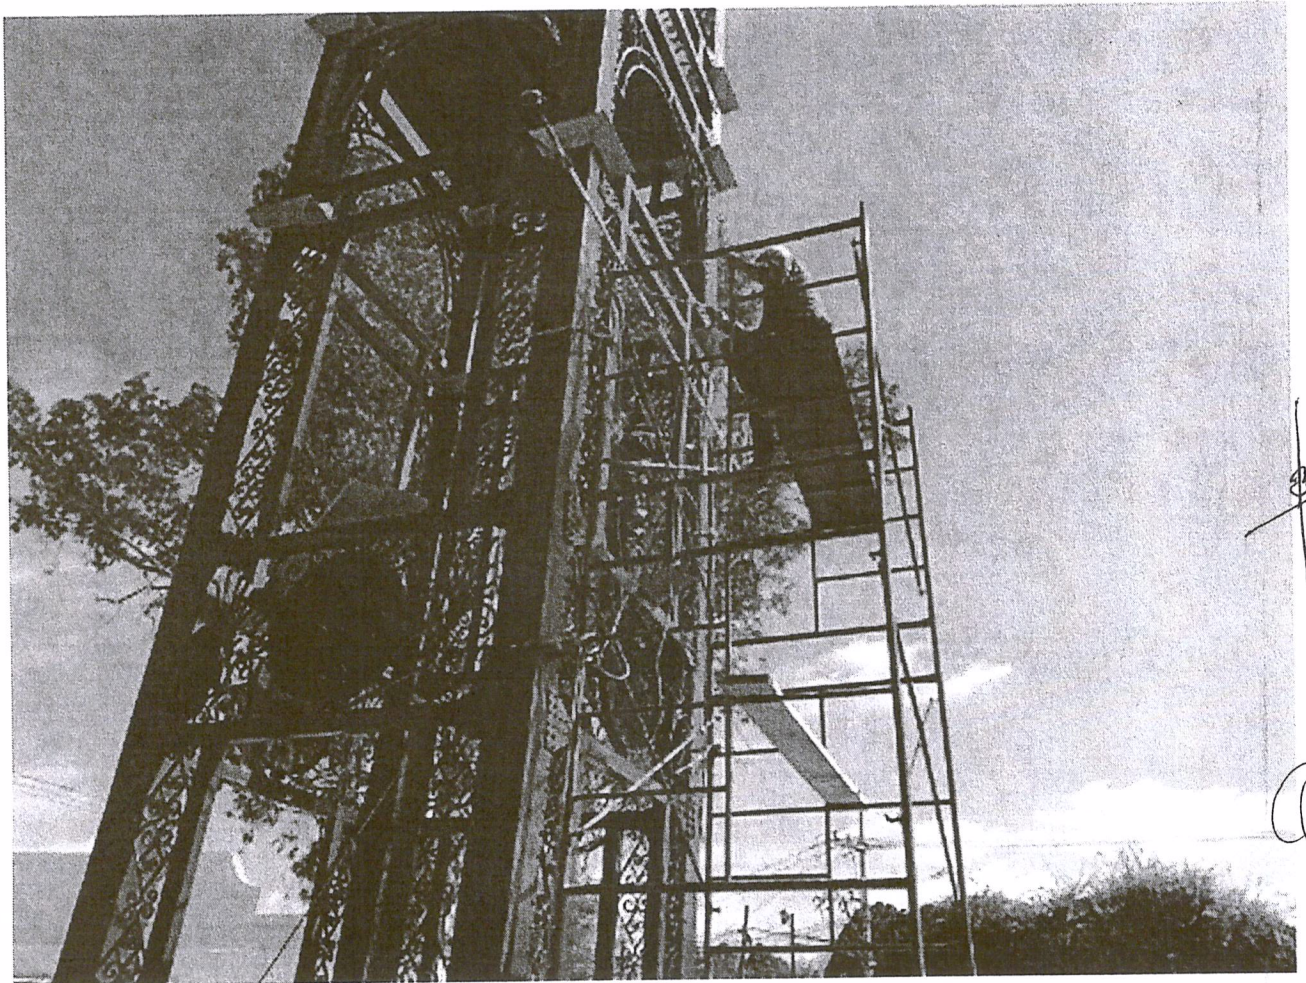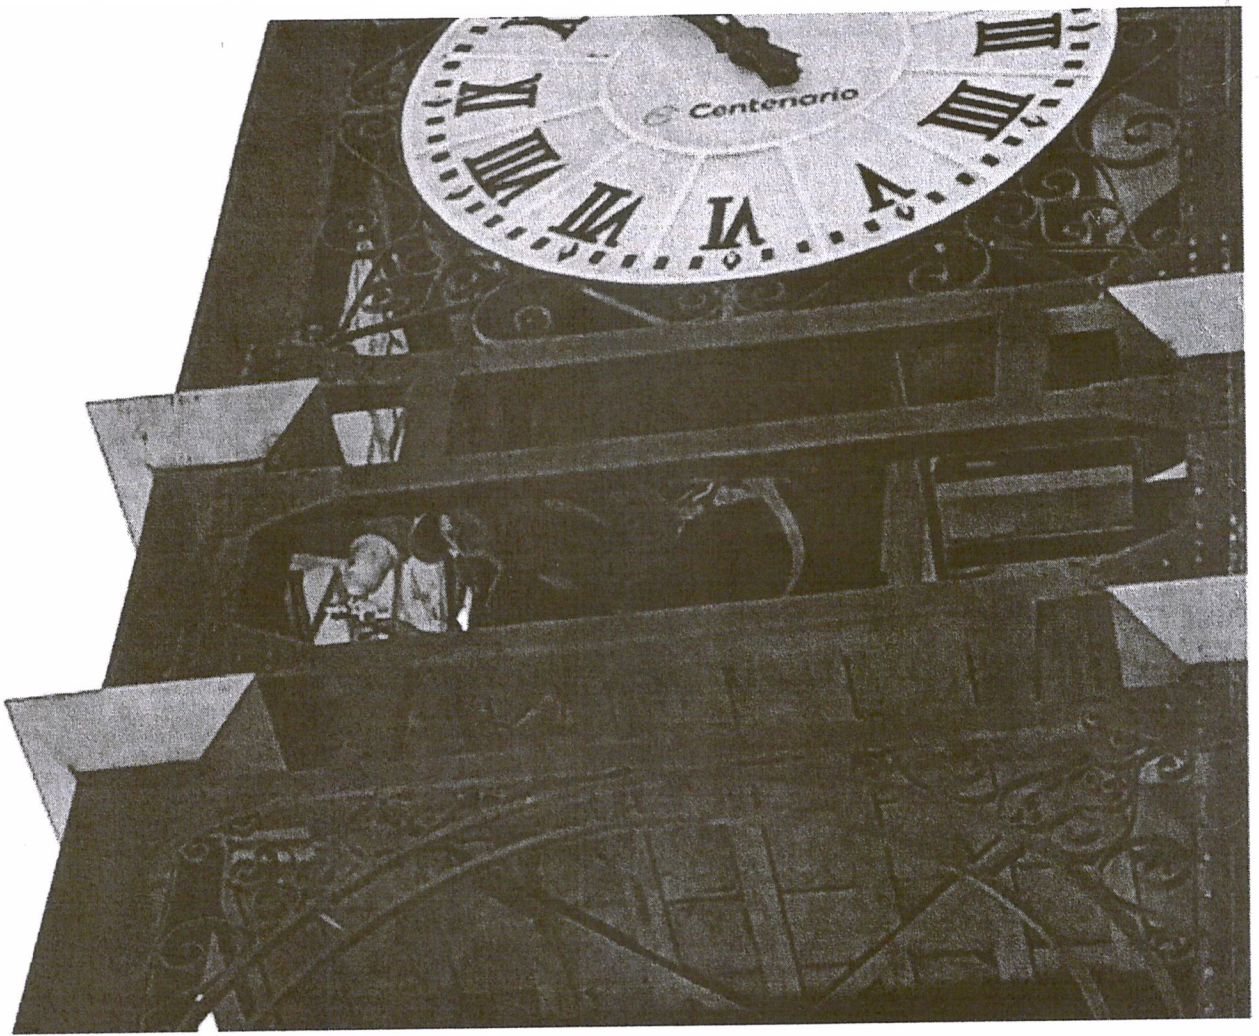

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



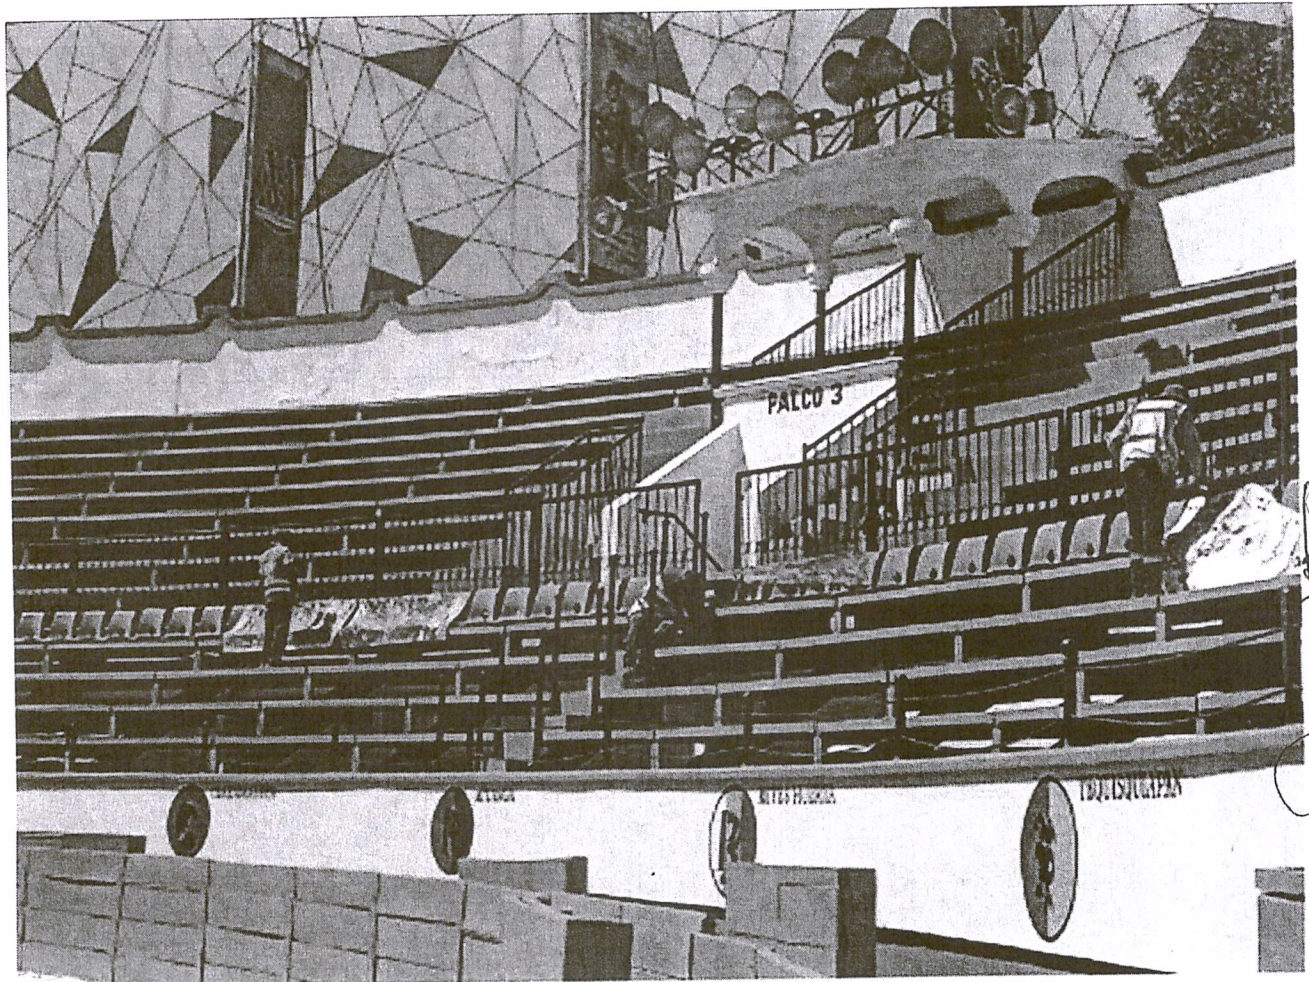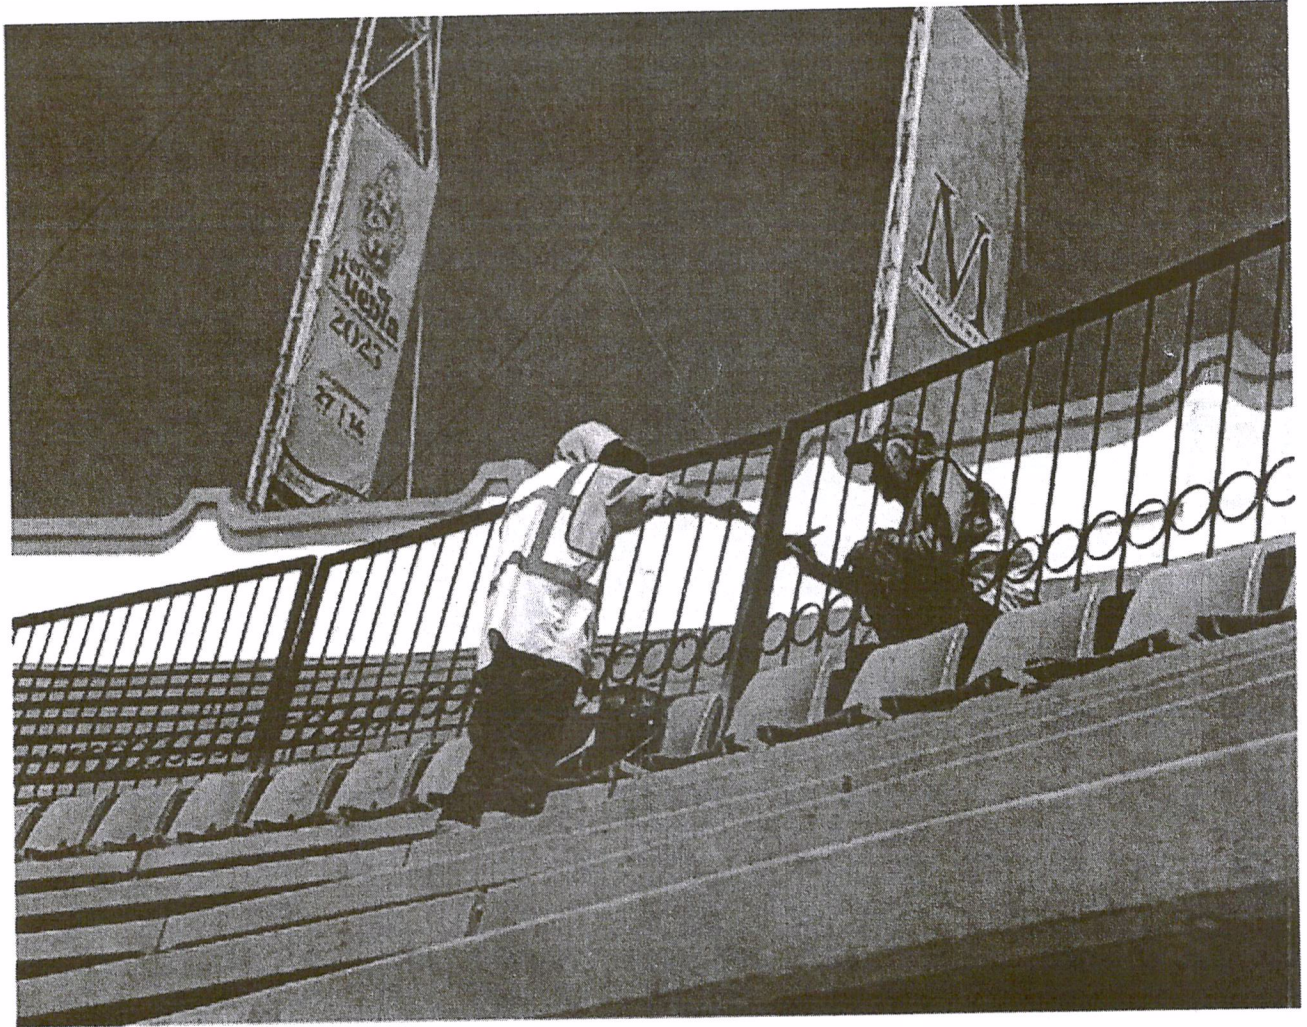



Convenciones  
y Parques

Recinto:	TEATRO PRINCIPAL	
	Fecha:	21-06-2024
	Número:	002

Descripción general:	Mantenimiento a los muros del recinto
----------------------	---------------------------------------

Responsable de supervisión:	Amalia Xicotencatl Petris		
Fecha de inicio:	08-06-2024	Fecha de cierre:	21-06-2024

Tareas a Ejecutar	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Preparación del área a intervenir</li><li>- Aplicación de pintura en de 450 metros cuadrados en muros interiores de los camerinos y fachadas principales</li></ul>	
Equipos requeridos:	6 brochas de 6 pulgadas y 4 rodillos de felpa lisa de 4 pulgadas, 3 cuerpos de andamios y 1 genie de tijera corta
Observaciones:	Actividad crucial para el aspecto de los espacios, proteger las superficies contra daños y prolongar su vida útil.

Supervisor: <b>Amalia Xicotencatl Petris</b>	Cargo: <b>Jefe de Departamento</b>
Ejecutor: <b>Julián Osorio Medrano</b>	Cargo: <b>Jefe de Mantenimiento</b>
Autoriza: <b>Sergio Bobadilla Valencia</b>	Cargo: <b>Subdirector de Mantenimiento</b>

Firma del Solicitante

Firma del Supervisor

Firma de autorizado



Centro Expositor  
Av. Ejércitos de Oriente 100, Centro Civico Cultural 5 de mayo,  
C.P. 72260  
Puebla, Puebla. Tel. 222 122 11 00. Ext. 1905  
[www.convencionespuebla.mx](http://www.convencionespuebla.mx)





Convenciones  
y Parques

Recinto:	Teatro Principal	
Fecha:	01-07-2024	
Número:	003	

Descripción general:	Se realizó el mantenimiento en los muros interiores y exteriores del recinto y zona de gradas mediante la aplicación de pintura vinílica y esmalte.
----------------------	---

Responsable de supervisión:	Amalia Xicotencatl Petris		
Fecha de inicio:	22-06-2024	Fecha de cierre:	29-06-2024

Tareas a Ejecutar	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Preparación y aplicación de pintura vinílica en 770 metros cuadrados de muros interiores, exteriores y bardas.</li><li>- Preparación y aplicación de pintura en 108 metros cuadrados de pintura esmalte en área de protecciones y balcones exteriores.</li><li>- Dando un total de 878 metros cuadrados.</li></ul>	<p>CONVENCIONES PUEBLA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO HORA: 01 JUL 2024 ENTREGA DE MATERIAL GENERAL</p>
Equipos requeridos:	9 rodillos de 9", 3 rodillos de 4", 3 extensiones para rodillo, 6 brochas de 4" ,1 genie de tijera corta.
Observaciones:	Actividad crucial para mejorar la estética de los espacios, proteger las superficies contra daños y prolongar su vida útil.

Supervisor: Amalia Xicotencatl Petris	Cargo: Jefe de Departamento
Ejecutor: Julián Osorio Medrano	Cargo: Jefe de Mantenimiento
Autoriza: Sergio Bobadilla Valencia	Cargo: Subdirector de Mantenimiento

Firma del Solicitante

Firma del Supervisor


Firma de autorizado

Recinto:	Centro de convenciones.	
	Fecha:	01-07-2024
	Número:	007

Descripción general:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN SALÓN PASTORA, ANALCO, LUZ Y ALTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES.
----------------------	---

Responsable de supervisión:	Roman Eduardo Arce Arce		
Fecha de inicio:	22-06-2024	Fecha de cierre:	28-06-2024

Tareas a Ejecutar	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reemplazo de 50 contactos dañados en salón Pastora.</li> <li>- Reemplazo de 15 lámparas fundidas en salón Analco, Luz y Alto.</li> <li>- Reemplazo de 5 focos fundidos salón Pastora.</li> <li>- Mantenimiento a 20 luminarios de cortesía en pasillos de salón Pastora.</li> </ul>	
Equipos requeridos:	Pinzas, desarmadores, cinta de aislar, multimetro.
Observaciones:	Se mejora la iluminación en áreas comunes del salones .



Supervisor: Roman Eduardo Arce Arce	Cargo: Jefe del departamento eléctrico
Ejecutor: Oswaldo Téllez Cielo	Cargo: Analista
Autoriza: Sergio Bobadilla Valencia	Cargo: Subdirector de mantenimiento




Firma del Ejecutor

Firma del Supervisor

Firma de autorizado

Descripción general:

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN SALÓN PASTORA, ANALCO, LUZ Y ALTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES.

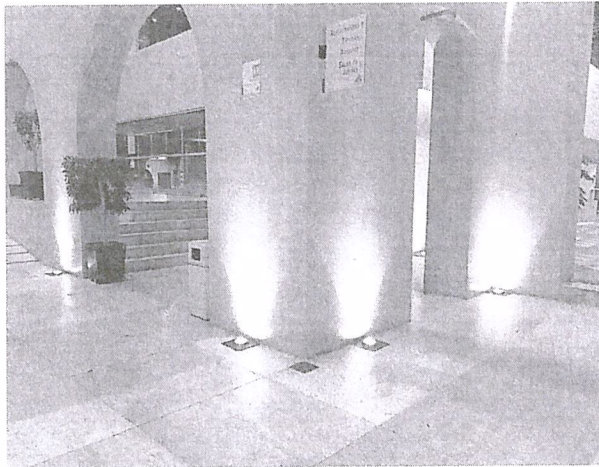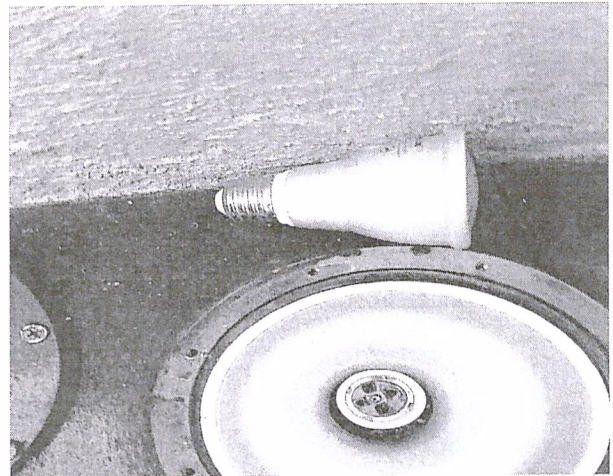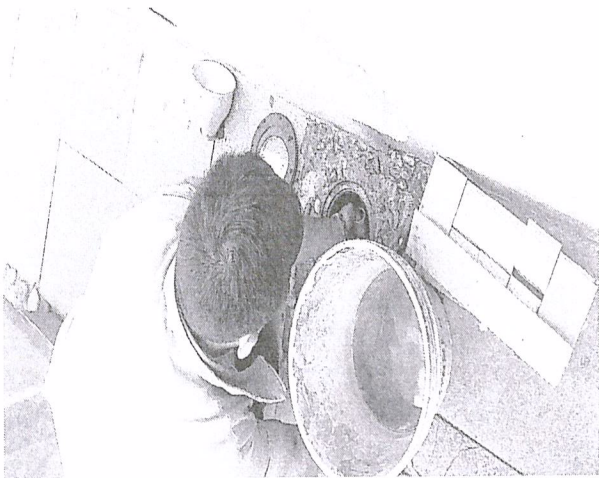

*[Handwritten signature]*

Firma del Ejecutor

*[Handwritten signature]*

Firma del Supervisor

*[Handwritten signature]*


Firma de autorizado

Recinto:	Centro Expositor.	
	Fecha:	01-07-2024
	Número:	008

Descripción general:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN SALÓN LORETO, SANITARIOS, LOBBY Y COCINA CENTRAL DEL CENTRO EXPOSITOR.
----------------------	--

Responsable de supervisión:	Roman Eduardo Arce Arce		
Fecha de inicio:	22-06-2024	Fecha de cierre:	28-06-2024

Tareas a Ejecutar	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Drenado de agua en registros eléctricos de media y baja tensión en subestación 5 de Loreto</li> <li>- Cambio de espuma de poliuretano en registros eléctricos de subestación 5.</li> <li>- Mantenimiento a 2 luminarios en cámara de refrigeración de cocina central.</li> <li>- Reemplazo de 3 focos fundidos en lobby.</li> <li>- Reemplazo de 10 focos en salon Loreto.</li> <li>- Reemplazo de 2 lamparas en sanitarios de Loreto.</li> </ul>	
Equipos requeridos:	Pinzas, desarmadores, cinta de aislar, multímetro, espuma de poliuretano.
Observaciones:	Se mejora la iluminación en área en salones y se continúa con el drenado de agua por temporada de lluvia.



Supervisor: Roman Eduardo Arce Arce	Cargo: Jefe del departamento eléctrico
Ejecutor: Abraham Sanchez Gonzalez	Cargo: Jefe de Sección
Autoriza: Sergio Bobadilla Valencia	Cargo: Subdirector de mantenimiento




Firma del Ejecutor

Firma del Supervisor

Firma de autorizado

Recinto :	Centro de Expositor
Fecha:	01-07-2024
Número:	008

Descripción general:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN SALÓN LORETO, SANITARIOS, LOBBY Y COCINA CENTRAL DEL CENTRO EXPOSITOR.
----------------------	--

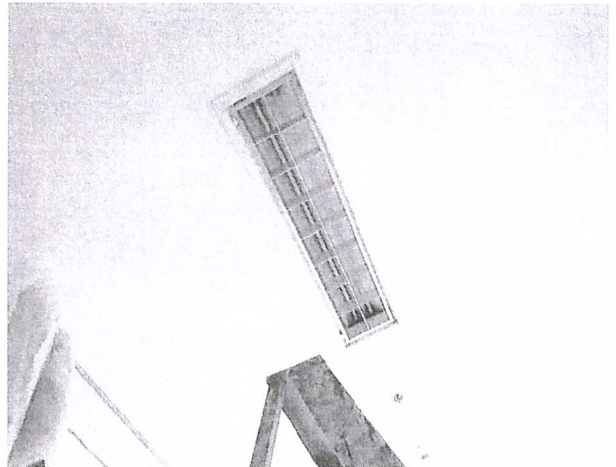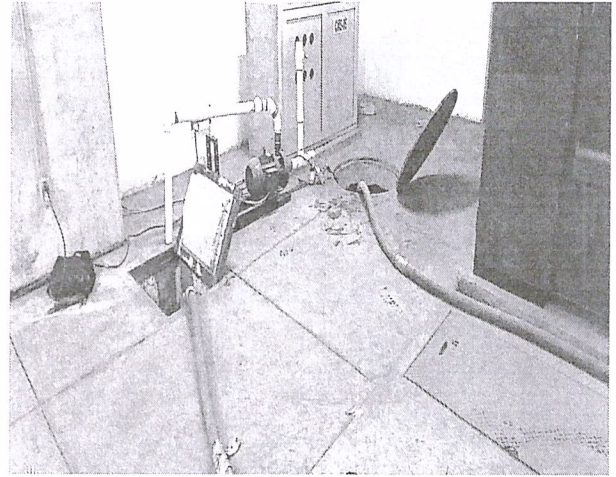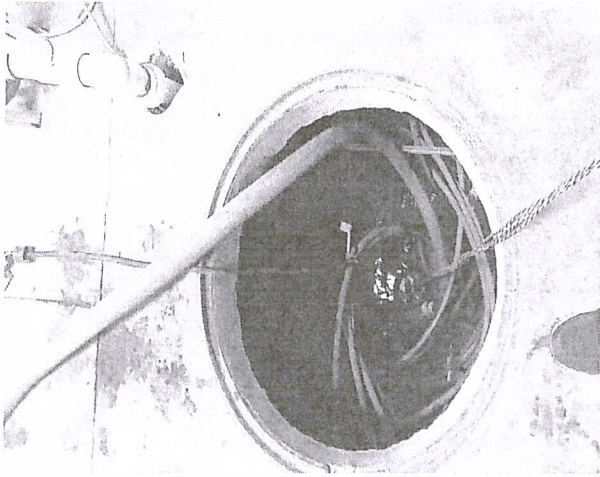

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Firma del Ejecutor

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Firma del Supervisor

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Firma de autorizado
